


Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Situação Atual das Obras Federais de Infraestrutura de Transportes em Santa Catarina

Agosto/2019

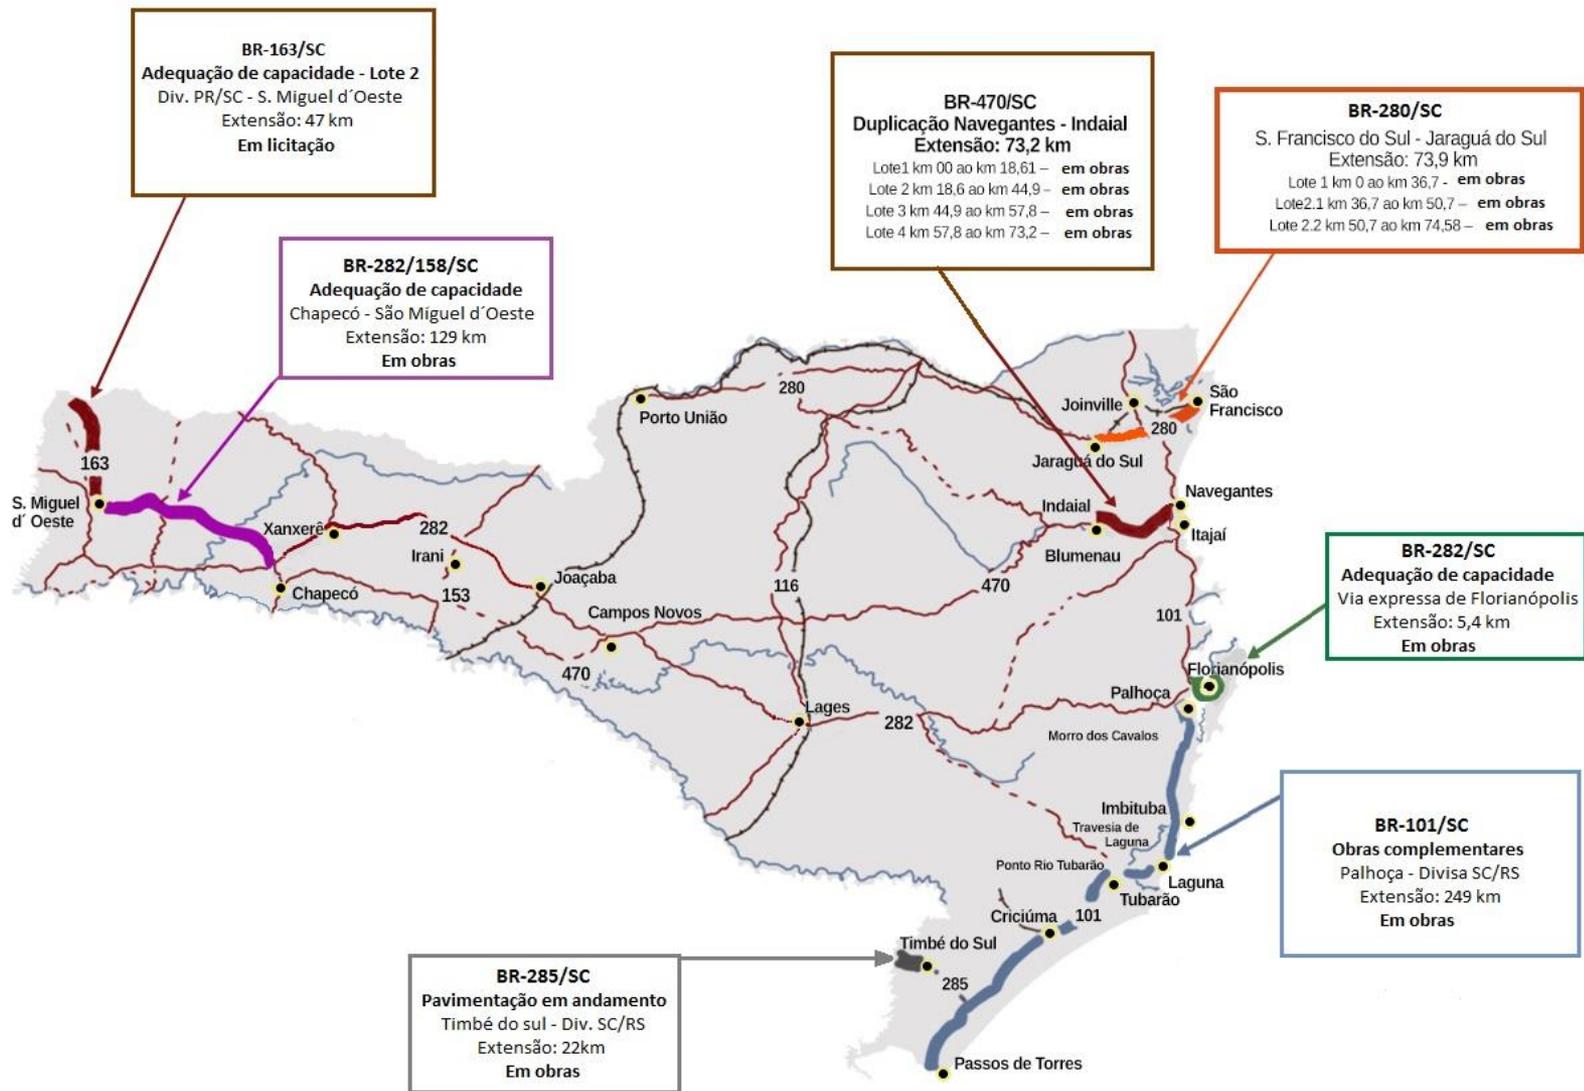

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

Contratos DNIT/SC

TOTAL: R\$ 3.426.755.000,00


EXECUTADO: R\$ 1.177.971.000,00

SALDO: R\$ 2.248.783.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	RÚBRICA	DETALHAMENTO	DOTACAO LOA	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO	DOTACAO ATUAL
26782208710JQ0042	10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 89.106.012,00	R\$ -	R\$ 89.106.012,00
26782208712080042	1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 6.300.000,00	R\$ -	R\$ 6.300.000,00
26782208712KF0042	12KF	Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Dionísio Cerqueira - na BR-163/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 10.780.354,00	-R\$ 9.780.354,00	R\$ 1.000.000,00
26782208720VM0042	20VM	Manutenção de Trechos Rodoviários na Região Sul - No Estado de Santa Catarina	R\$ 141.416.649,00	R\$ -	R\$ 141.416.649,00
26782208775300042	7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 98.272.508,00	-R\$ 10.000.000,00	R\$ 88.272.508,00
2678220877N850042	7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 45.127.785,00	R\$ -	R\$ 45.127.785,00
2678220877X980042	7X98	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 35.000.000,00	-R\$ 4.270.000,00	R\$ 30.730.000,00
Total Geral			R\$ 426.003.308,00	-R\$ 24.050.354,00	R\$ 401.952.954,00

BR 280/SC

Extensão: km 0,00 – km 309,8 – Contorno: km 0 – 23,9

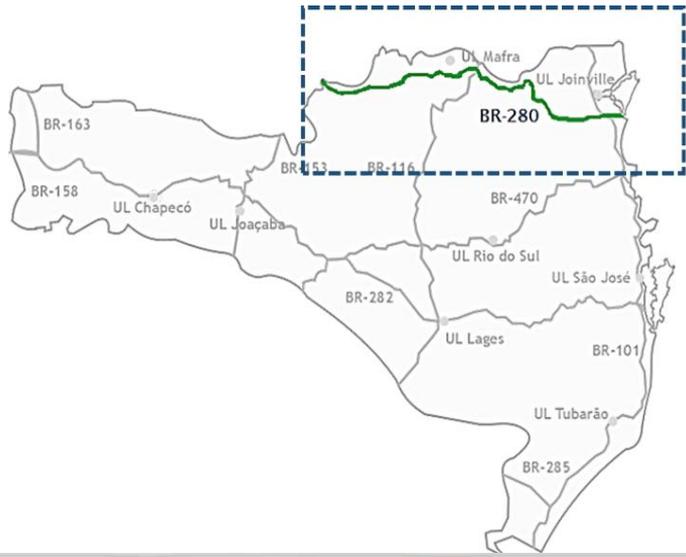

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-280/SC

TOTAL: R\$ 1.470.594.000,00

EXECUTADO: R\$ 422.181.000,00

SALDO: R\$ 1.048.413.000,00

BR 280/SC – Lote 1

Extensão: km 0,6 – km 36,6

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 368.874.925,11	R\$ 8.306.732,02	R\$360.568.193,09	R\$ 20.029.969,00	R\$ 11.723.236,98

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 11,7 milhões

- 4 km de terraplenagem do Contorno de São Francisco.

2020: R\$ 110 milhões

- Conclusão do Contorno de São Francisco;
- 1 Viaduto (IFC).

BR 280/SC – Lote 2.1

Extensão: km 36,6 – km 50,74

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 162.021.990,25	R\$ 68.348.944,90	R\$ 93.673.045,35	R\$ 79.508.116,00	R\$ 11.159.171,01

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 11,1 milhões

- 1 Viaduto;
- 4km de pavimentação.

2020: R\$ 54 milhões

- 1,6 km de pavimentação;
- Finalização dos serviços geotécnicos (aterros monitorados);
- 1 Ponte;
- 1 Viaduto;
- 1 Passarela.

BR 280/SC – Lote 2.2

Extensão: km 50,74 – km 74,58

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 606.361.291,94	R\$260.957.171,35	R\$345.404.120,59	R\$287.374.051,49	R\$ 26.416.880,14

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 26,4 milhões


- 1 Ponte;
- 12km de terraplanagem.

2020: R\$ 136 milhões

- Conclusão da terraplanagem em todo o trecho;
- Conclusão dos túneis (revestimentos, drenagem e pavimentação).

BR 470/SC

Extensão: Km 0,00 – Km 356,6

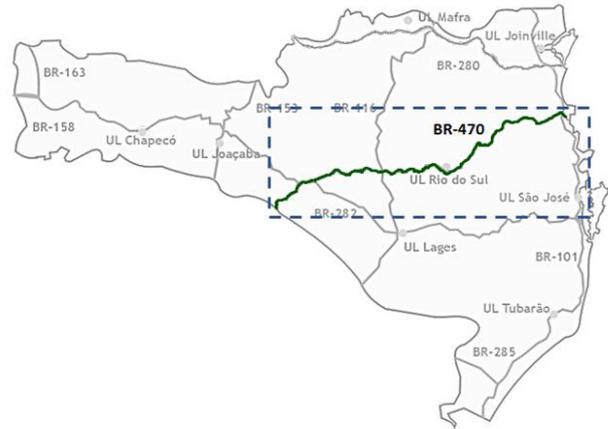

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-470/SC

TOTAL: **R\$ 1.257.914.000,00**

EXECUTADO: **R\$ 549.467.000,00**

SALDO: **R\$ 708.447.000,00**

BR 470/SC – Lote 1

Extensão: km 0,00 – km 18,61

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 246.590.344,50	R\$114.541.232,15	R\$132.049.112,35	R\$122.572.409,89	R\$ 8.031.177,70

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 8 milhões

- Conclusão de 4,5 km de Duplicação.

ATÉ DEZEMBRO 2019 com mais R\$ 20 milhões

- Conclusão de 4,5 km de Duplicação + 4,5 km de Restauração.

2020: R\$ 60 milhões

- Conclusão de 03 Viadutos;
- Conclusão de 2,0 km de Duplicação + 2,0 km de Restauração.

BR 470/SC – Lote 2

Extensão: km 18,61 – km 44,87

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 383.515.829,90	R\$294.080.749,39	R\$ 89.435.080,51	R\$297.372.241,69	R\$ 3.291.492,30

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 3 milhões

- Obras de Terraplanagem, Drenagem e Complementares.

ATÉ DEZEMBRO 2019 com mais R\$ 35 milhões

- Conclusão de + 6,5 km de Duplicação;
- Conclusão de 14,5 km de Restauração.

2020: R\$ 100 milhões

- Conclusão das Obras.

BR 470/SC – Lote 3

Extensão: Km 44,87 – Km 57,78

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 178.350.260,32	R\$ 42.217.760,87	R\$136.132.499,45	R\$ 46.947.997,57	R\$ 4.730.236,70

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 4,7 milhões

- Pavimentação de 4,0 km da rodovia.
- Conclusão de 2 Viadutos.

ATÉ DEZEMBRO 2019 com mais R\$ 25 milhões

- Conclusão de 3 Viadutos e 3 Pontes.

2020: R\$ 80 milhões

- Conclusão de 4 Pontes, Viaduto Mafisa e Viaduto Badenfurt;
- Conclusão de 6 km de duplicação (km 44 ao km 50).

BR 470/SC – Lote 4

Extensão: km 57,78 – km 73,18

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 213.733.823,89	R\$ 25.162.563,05	R\$188.571.260,84	R\$ 60.000.000,00	R\$ 34.837.436,95

ATÉ DEZEMBRO 2019 com Empenho Atual de R\$ 34.8 Milhões (RAP)


- Conclusão de 5,5 km de duplicação;
- Conclusão de 3 Pontes e 1 Viaduto;
- Conclusão das Obras de Contenção.

2020: R\$ 60 Milhões

- Conclusão de + 3 Pontes;
- Conclusão de + 5 Viadutos.

BR 285/SC

Extensão: Km 33,8 – Km 55,8

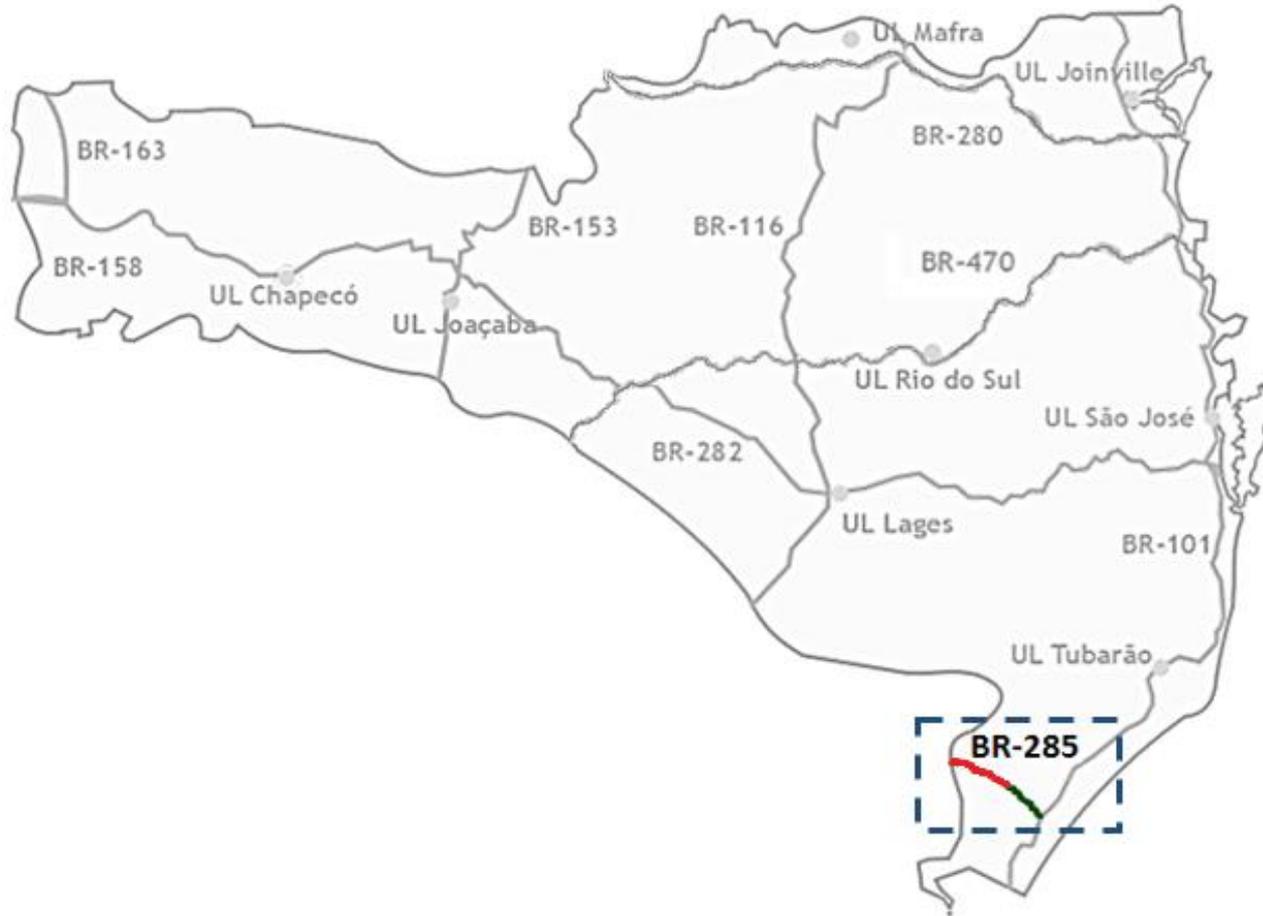

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-285/SC

TOTAL: **R\$ 162.701.000,00**

EXECUTADO: **R\$ 102.853.000,00**

SALDO: **R\$ 59.848.000,00**

BR 285/SC – Lote Único

Extensão: Km 33,8 – Km 55,8

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 118.528.973,77	R\$ 75.982.405,94	R\$ 42.546.567,83	R\$ 98.337.728,56	R\$ 22.355.322,62

ATÉ DEZEMBRO 2019: Empenho Atual R\$ 22.3 milhões.


- Conclusão de 7km de pavimento rígido;
- Conclusão de 3 viadutos.

2020: R\$ 44 milhões.

- Conclusão da obra.

BR 101/SC

Extensão: km 245,0 – km 465,0

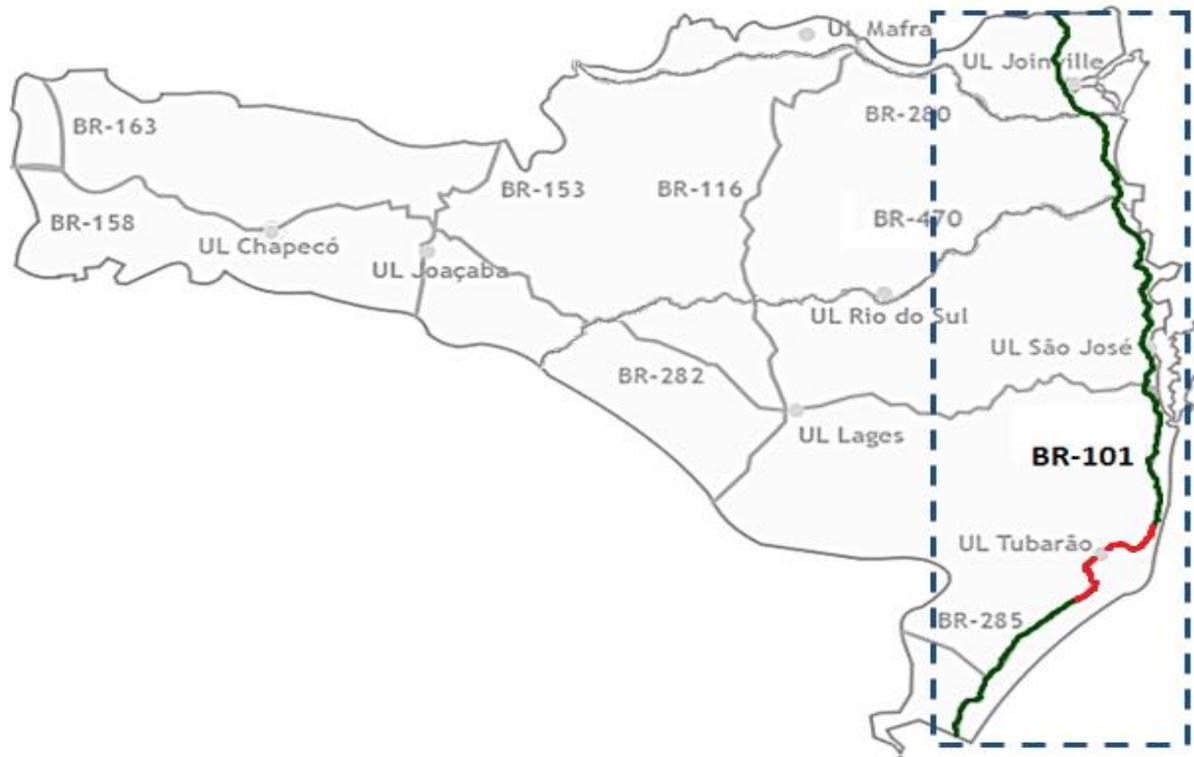

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-101/SC

TOTAL: R\$ 53.570.000,00

EXECUTADO: R\$ 33.423.000,00

SALDO: R\$ 20.147.000,00

BR 101/SC – Lote Único

Extensão: km 310,0 – km 330,0

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 45.298.499,45	R\$ 29.679.555,57	R\$ 15.618.943,88	R\$ 30.266.651,80	R\$ 587.096,23


ATÉ DEZEMBRO 2019: Empenho Atual R\$ 587 mil

- Conclusão das Vias Laterais Iniciadas.

BR 163/SC

Extensão: km 78,62 – km 122,60/km 0,00 – 3,60

Contrato: 192/2019

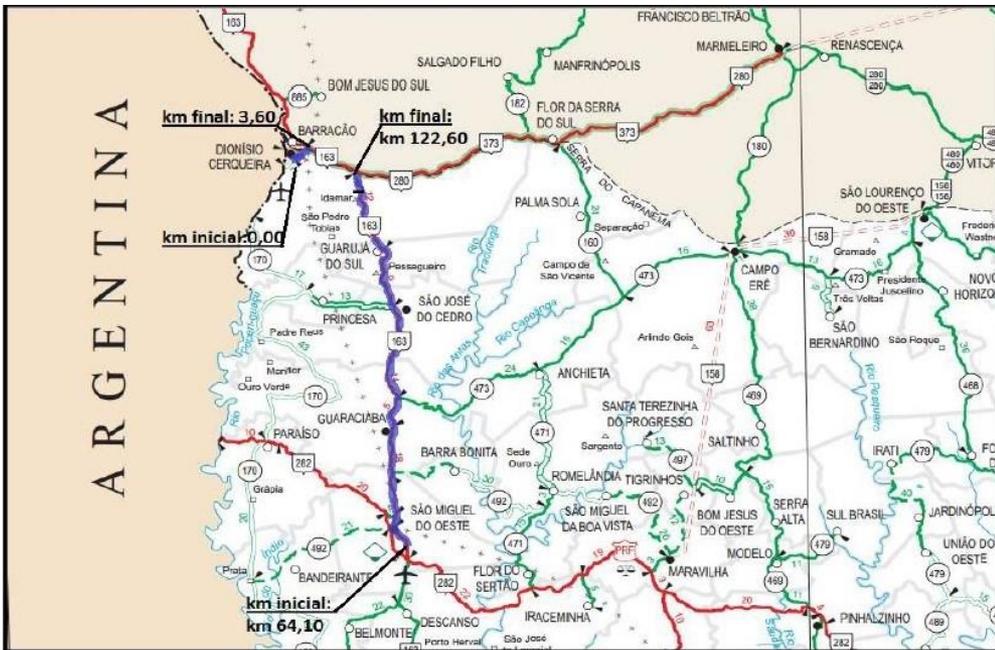



ATÉ DEZEMBRO 2019: Empenho Atual R\$ 1.000.000,00

- Projetos Básico Parcial.

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 210.000.000,00	R\$ -	R\$210.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

BR 282/SC – Via Expressa

Extensão: km 0,0 – km 684,2

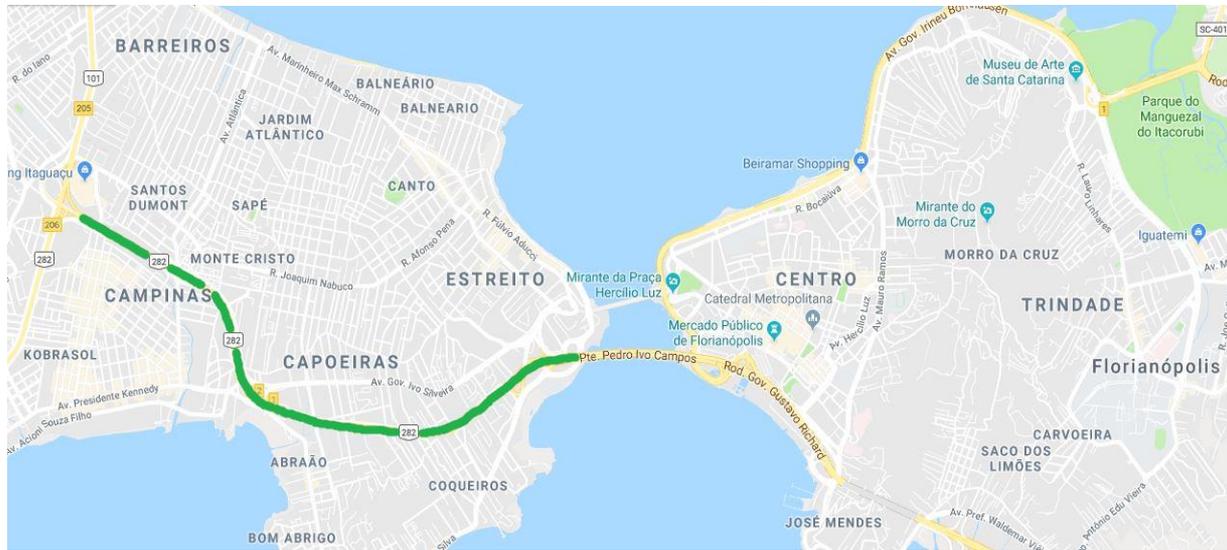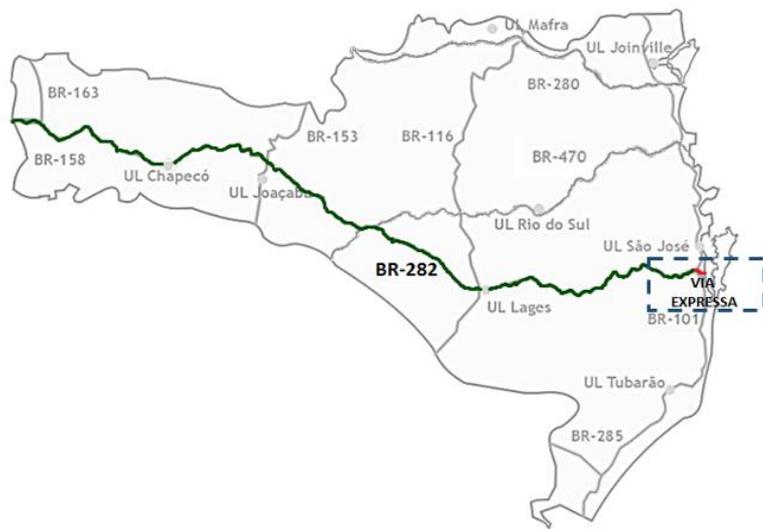

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-282/SC Via Expressa

TOTAL: R\$ 27.662.000,00

EXECUTADO: R\$ 23.340.000,00

SALDO: R\$ 4.322.000,00

BR 282/SC – Via Expressa

Extensão: km 0,0 – km 684,2


CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 27.662.148,90	R\$ 23.047.476,14	R\$ 4.614.672,76	R\$ 26.000.000,00	R\$ 2.952.523,86

ATÉ DEZEMBRO 2019: Empenho Atual R\$ 2.9 milhões

- Aguardando a criação da Rubrica.

BR 282/SC/BR 158/SC

Extensão: km 0,00 – km 684,2/km 98,9 – 152,2

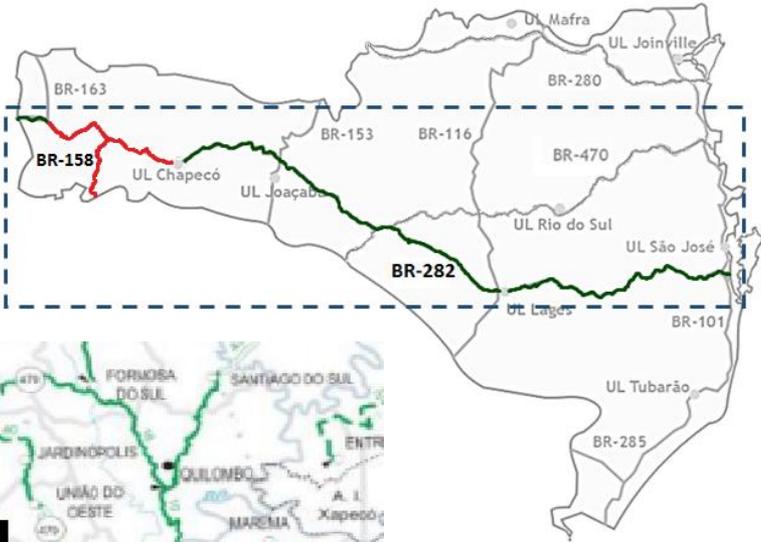

Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina

Agosto/2019

BR-158/SC e BR-282/SC

TOTAL: **R\$ 170.985.000,00**

EXECUTADO: **R\$ 15.517.000,00**

SALDO: **R\$ 155.468.000,00**

BR 282/SC/BR 158/SC

Extensão: km 534,8 – km 650,7/km 98,9 – km 147,3

CONTRATO (PI+R)	MEDIDO (PI+R)	SALDO CONTRATUAL (PI+R)	TOTAL EMPENHADO	SALDO DE EMPENHO
R\$ 162.416.550,38	R\$ 15.517.948,26	R\$146.898.602,12	R\$ 23.523.261,00	R\$ 8.005.312,74

ATÉ DEZEMBRO 2019: Empenho Atual R\$ 8 milhões

- Conclusão de 20 km de terraplanagem – 3ª faixas.

ATÉ DEZEMBRO 2019 com mais R\$ 69 milhões

- 33 km de terceiras faixas - BR 282.

2020: R\$ 70 milhões

- 138 km de restauração de pista existente: 115 km - BR 282.
23 km - BR 158.
