



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA



INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES


- 15 Obras em Destaque -

Fevereiro/2016





SITUAÇÃO GERAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA

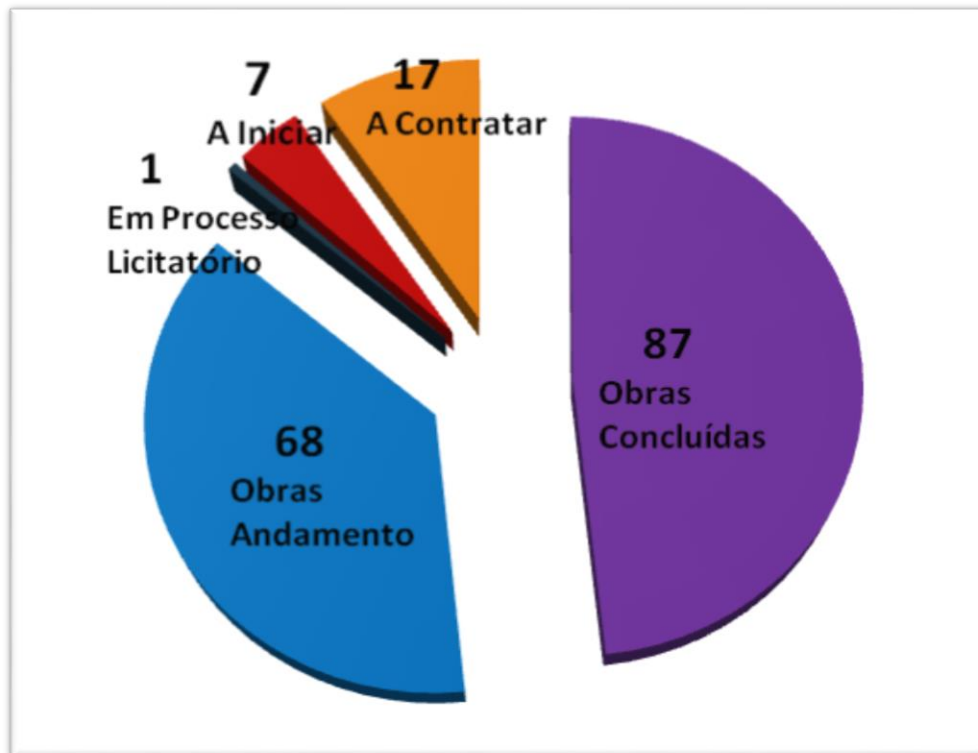

Estão em andamento 68 contratos de obras



RECUPERAÇÃO DA PONTE HERCÍLIO LUZ

Data de início: 18/04/2016

Previsão de conclusão: 24/05/2019

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 387.158.376,57

Financiamento: BNDES e Banco do Brasil

Abrangência: Grande Florianópolis

Pendências/entraves: -----

ETAPA FINAL - 8 PASSOS



1. Reforço das fundações (continental, insular e embaixo d'água)
2. Transferência de carga (suspensão do vão central)
3. Troca das barras de olhais e pendurais
4. Recuperação das vigas treliçadas do vão central e dos viadutos
5. Recuperação das 2 torres centrais
6. Trocas das selas e rótulas
7. Execução do tabuleiro (pista de rolagem)
8. Desmontagem da estrutura provisória - transferência de carga para a estrutura da ponte





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA ANTÔNIO HEIL (20,91 KM)

Data de início: 13/10/2014

Previsão de conclusão: 31/03/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 158.140.440,17

Financiamento: BID e Banco do Brasil

Abrangência: Vale do Itajaí / Itajaí e Brusque

Pendências/entraves: Finalização de desapropriações





PAVIMENTAÇÃO DA SC-477, PAPANDUVA / DR PEDRINHO (99,27 KM)

Data de início: 13/10/2014

Previsão de conclusão: 22/09/2018

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 225.019.025,69

Financiamento: CAF e Banco do Brasil

Abrangência: Planalto Norte

Pendências/entraves: -----





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESTAURAÇÃO OTACÍLIO COSTA - ENTR. BR-282 (A) PARA LAGES

Data de início: 10/08/2016

Previsão de conclusão: 31/07/2018

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 82.510.252,67

Financiamento: BID e Banco do Brasil

Abrangência: Planalto Norte

Pendências/entraves: -----





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

REABILITAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA SC-114, TRECHO LAGES - PAINEL - SÃO JOAQUIM

Data de início: 01/08/2013

Previsão de conclusão: 28/01/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 104.045.644,83

Fonte de Financiamento: BID e Banco do Brasil

Abrangência: Planalto Serrano

Pendências/entraves: -----





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SUL DA ILHA / FLORIANÓPOLIS

Pavimentação de Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz, incluindo Obras de Artes

Data de início: 13/08/2015

Previsão de conclusão: 02/08/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 102.104.417,34

Fonte de Financiamento: BNDES e Banco do Brasil

Abrangência: Grande Florianópolis

Pendências/entraves: Licitação de obras no Lote 2 B (2,6 km) e necessidade de execução de desapropriações.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESTAURAÇÃO DA SC-157, SÃO LOURENÇO DO OESTE – CHAPECÓ

Data de início: 01/04/2014

Previsão de conclusão: 05/07/2017

Situação atual: Concluída / Andamento

Valores (R\$): 173.601.335,46

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil

Abrangência: Oeste

Pendências/entraves: -----

Restauração do Corredor Oeste: divisa com Paraná até Chapecó, abrangendo a restauração de três trechos da rodovia





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO DA VIA RÁPIDA TRECHO CRICIÚMA - BR-101

Data de início: 04/02/2013

Previsão de conclusão: 31/07/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 107.667.056,07

Fonte de Financiamento: BID e Banco do Brasil

Abrangência: Sul / Criciúma

Pendências/entraves: Finalização de desapropriações





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO DA SC-370, CONTORNO DE TUBARÃO

Data de início: 20/11/2014

Previsão de conclusão: 09/11/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 56.439.108,32

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil e
Fundo Pró-emprego

Abrangência: Sul / Tubarão

Pendências/entraves: Finalização de desapropriações





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PORTOS DE ITAJAÍ E NAVEGANTES - CONSTRUÇÃO DE NOVA BACIA DE EVOLUÇÃO

Data de início: 18/03/2015

Previsão de conclusão: 29/08/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 110.989.501,67

Fonte de Financiamento: BNDES e Banco do Brasil

Abrangência: Vale do Itajaí

Pendências/entraves: Aprovação do BNDES para liberação de recursos e definição de execução de etapa complementar de obra (aditivo ao atual contrato da SIE) tendo em vista indefinição de aporte de recursos do Governo Federal





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA SC-108 - ACESSO NORTE DE BLUMENAU

Data de início: 08/09/2014

Previsão de conclusão: 16/07/2018

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 147.587.538,46

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil

Abrangência: Blumenau

Pendências/entraves: (i) Obra contratada para 19 km, entretanto estão assegurados recursos somente para os primeiros 2 km, onde as obras efetivamente estão ocorrendo. (ii) desapropriações limitam o avanço das obras nos 2 km iniciados.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DUPLICAÇÃO AVENIDA SANTOS DUMONT

Duplicação do trecho compreendido entre a Rua Dona Francisca e o Aeroporto de Joinville, no município de Joinville, incluindo Elevado de Interseção com a Rua Tuiuti (8,01 km).

Data de início: 26/02/2013

Previsão de conclusão: 21/04/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 79.985.945,75

Financiamento: BNDES e Banco do Brasil

Abrangência: Joinville

Pendências/entraves: Finalização de desapropriações
de responsabilidade
da Prefeitura de Joinville





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE SEARA

Data de início: 15/05/2014

Previsão de conclusão: 04/05/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 33.038.129,80

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil e
Fundo Pró-emprego

Abrangência: Seara

Pendências/entraves: -----





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE XANXERÊ

Data de início: 06/10/2014

Previsão de conclusão: 28/04/2017

Situação atual: Andamento

Valores (R\$): 27.468.387,57

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil e
Fundo Pró-emprego

Abrangência: Xanxerê

Pendências/entraves: -----





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RITA MARIA / FLORIANÓPOLIS

Data de início: 24/04/2013

Previsão de conclusão: 30/11/2016

Situação atual: Aguardando conclusão do contrato CT-002/2015

Valores (R\$): 13.058.492,77

Fonte de Financiamento: Banco do Brasil e Fundo Pró-emprego

Abrangência: Florianópolis

Pendências/entraves: -----





PREVISÃO INAUGURAÇÃO OBRAS 1º SEMESTRE

Obra	Previsão de Inauguração
Execução das obras de restauração do Terminal Rodoviário Rita Maria, no município de Florianópolis - LOTE 01: Revitalização do pavimento asfáltico, pátio do estacionamento frontal e o pátio do estacionamento lateral	mar-17
Execução do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Caçador	mar-17
Implantação do Contorno Leste de Xanxerê	abr-17
Painel - São Joaquim (Incluindo Restauração da Travessia Urbana de São Joaquim)	abr-17
Reabilitação da SC-114 - BR 282/Lages - Painel	mai-17
BR-101 - Morro da Fumaça	jun-17
Restauração Entr. SC-159/Acesso à Irati (Formosa do Sul) – Entroncamento SC-482 (Acesso à União do Oeste)	jun-17



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PREVISÃO INAUGURAÇÃO OBRAS 2º SEMESTRE

Obra	Previsão de Inauguração
Execução de 3 Pontes no trecho Iomerê-Treze Tílias	ago-17
Pavimentação Iomerê - Treze Tílias	ago-17
Travessia Urbana de Rio das Antas	ago-17
Ampliação de Capacidade e Melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville	dez-17
Ampliação de Capacidade e Melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville (Interseção Tuiuti)	dez-17
Jaborá - BR-153	jul-17
Entr. BR-116 - Campo Belo do Sul	jul-17
Revitalização Araranguá - Meleiro (Entr. SC-443)	ago-17
Reabilitação SC-110 Trecho Entr. BR-470 - Lontras	ago-17
BR-101 - Garuva (Contorno de Garuva)	ago-17
Conclusão dos Serviços do Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Lote 01a : Interseção SC-405 à Interseção de Acesso ao Bairro Carianos, 3,55 km)	set-17
Reabilitação da SC-283 Trecho Chapecó - Planalto Alegre 20,59 km	set-17
Lote 01: Papanduva - Entr. SC-114	set-17
Conclusão da Obra de Moema (Volta Triste) - Início Variante / Início Variante - Entr. Acesso Volta Grande	set-17
Videira - Tangará	set-17
Reabilitação São Joaquim - Entr. SC 110/390 - Rio Porteira - Bom Jardim da Serra - Alto da Serra Rio do Rastro SC-390	out-17



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PREVISÃO INAUGURAÇÃO OBRAS 2º SEMESTRE

Obra	Previsão de Inauguração
Ituporanga - Entr. SC-281	out-17
Criciúma - BR/101 (Acesso Secundário)	out-17
Criciúma - BR/101 (Via Expressa)	dez-17
Restauração - BR-280 - São Bento do Sul - Fragosos	nov-17
Construção de Ponte na SC-370, no trecho a ser pavimentado entre o Alto da Serra do Corvo Branco e Aiurê	dez-17
Restauração da rodovia no trecho Jaraguá do Sul (trevo da Malwee) - Pé da Serra (Pomerode)	dez-17
Tangará - Luzerna	jan-18
Pavimentação da SC-370, Urubici-Grão Pará, Lote 3: Aiurê - Grão Pará (23,468 km)	fev-18
Conclusão dos Serviços do Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz (Lote 02: Interseção de Acesso ao Bairro Carianos à nova área do Terminal Aeroportuário, 6,48 Km)	jul-18
OAE Aeroporto Lote 2: AMPLIAÇÃO E ELEVAÇÃO DA PONTE EXISTENTE SOBRE O RIO TAVARES na Rodovia SC-401 e Lote 3: Viaduto da Interseção Carianos	jul-18
