

DNIT

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

SANTA CATARINA

SITUAÇÃO ATUAL DAS OBRAS FEDERAIS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



Orçamento 2020



EMPREENDIMENTO	RECURSOS PRÓPRIOS	EMENDA
10JQ 0042 - Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 70.765.528,00	R\$ 0,00
12KF 0042 - Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 0,00	R\$ 16.317.430,00
13Y0 4497 - Adequação da Via Expressa de Florianópolis - na BR-282/SC - No Município de Florianópolis - SC	R\$ 2.151.432,00	R\$ 0,00
7530 0042 - Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 93.493.162,00	R\$ 0,00
7N85 0042 - Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 18.597.461,00	R\$ 14.931.426,00
7XJ5 0042 - Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$ 26.358.181,00	R\$ 50.000.000,00
TOTAL	R\$ 211.365.764,00	R\$ 81.248.856,00

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA



EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS



BR-163 Ampliação de Capacidade

km 0,00 ao km 3,60
km 78,60 ao km 122,60
Extensão: 47,6 km

BR-280 Duplicação

Km 0,70 ao km 36,70
km 36,68 ao km 50,74
km 50,74 ao km 74,58
Extensão: 73,9 km

BR-470 Duplicação

km 0,00 ao km 18,61
km 18,61 ao km 44,87
km 44,87 ao km 57,78
km 57,78 ao km 73,18
Extensão: 73,2 km

BR-285 Implantação

km 33,80 ao km 55,80
Extensão: 22 km




BR-158 Adequação

km 98,90 ao km 147,30
Extensão: 48,4 km

BR-282 Adequação

km 534,80 ao km 650,70
Extensão: 115,9 km

Duplicação e Restauração – na BR-280/SC – 73,9 km

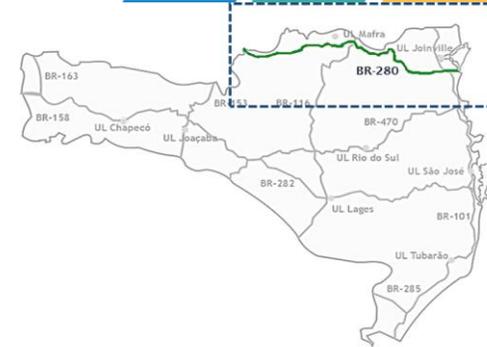


- **DESCRIÇÃO:** Execução das obras de duplicação da rodovia incluindo restauração e melhoramentos para adequação de capacidade e segurança na BR 280/SC.
- **LOA 2020:** R\$ 73.725.701,00
- **VALOR EMPENHADO:** R\$ 70.765.528,00

LOTES	1.1	2.1	2.2
- VALOR CONTRATADO:	R\$ 368.874.925,11	R\$ 172.665.721,29	R\$ 741.716.330,86
- SALDO CONTRATUAL:	R\$ 339.492.310,63	R\$ 88.197.464,16	R\$ 410.574.401,49
- SALDO DE EMPENHO:	R\$ 5.144.852,19	R\$ 8.296.945,57	R\$ 16.732.122,12



SITUAÇÃO


- Lote 1.1: 7,5% concluído;
- Lote 2.1: 44% concluído;
- Lote 2.2: 47% concluído;

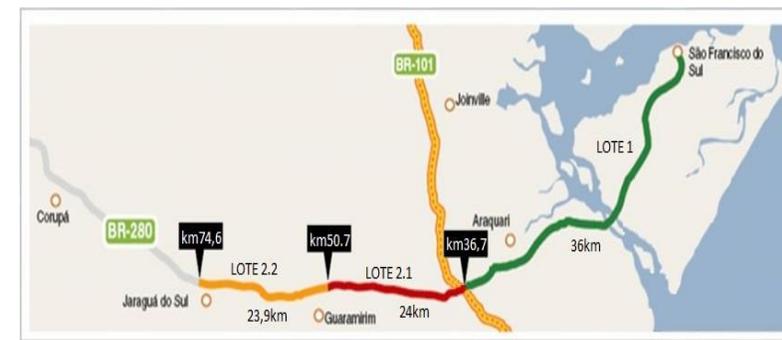

Duplicação e Restauração – na BR-470/SC – 73,18 km



- **DESCRIÇÃO:** Execução das obras de duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação, reforço, reabilitação e construção de OAEs - 4 Lotes
- **LOA 2020:** R\$ 73.726.597,00 / **DOTAÇÃO SUPLEMENTAR:** R\$ 35.945.319,00
- **VALOR EMPENHADO:** R\$ 106.747.843,00

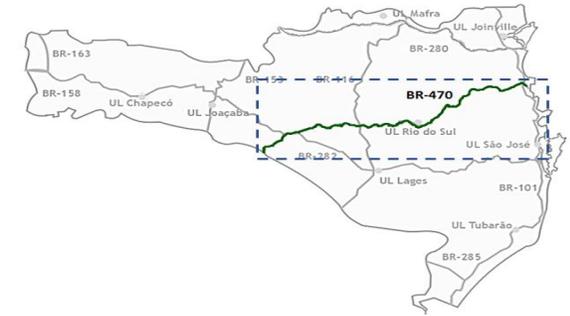

LOTES	1	2	3	4
- VALOR CONTRATADO:	R\$ 257.014.609,93	R\$ 461.187.139,05	R\$ 248.508.143,17	R\$ 302.896.607,30
- SALDO CONTRATUAL:	R\$ 120.055.593,40	R\$ 107.922.068,85	R\$ 175.701.859,39	R\$ 219.477.018,50
- SALDO DE EMPENHO:	R\$ 4.882.855,45	R\$ 9.008.432,70	R\$ 1.887.032,79	R\$ 1.003.288,30



SITUAÇÃO

- Lote 1: 51,4% concluído;
Duplicação: 7 km concluídos.
- Lote 2: 78% concluído;
Duplicação: 17,5 km concluídos;
- Lote 3: 30,87% concluído (Trevo da Mafisa entregue ao trafego);
Duplicação: 3,5 km concluídos;
- Lote 4: 29% concluído;
Duplicação: 2 km concluídos.



Adequação, restauração e melhoramento da capacidade – na BR-163/SC – 47,58 km



- **DESCRIÇÃO:** Contratação Integrada dos Serviços de Elaboração dos Projetos Básico e Executivo e Construção das Obras de Adequação para Ampliação da Capacidade, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-163/SC.
- **LOA 2020:** R\$ 17.000.000,00
- **VALOR EMPENHADO:** R\$ 15.047.448,23

LOTES

Único

- **VALOR CONTRATADO:** R\$ 210.000.000,00
- **SALDO CONTRATUAL:** R\$ 210.000.000,00
- **SALDO DE EMPENHO:** R\$ 15.952.551,77

SITUAÇÃO

- Ordem de serviço expedida em 06/08/2019.
- Projeto Básico entregue pela contratada ao DNIT, em fase de aprovação. Projeto executivo em desenvolvimento.



Implantação na BR-285/SC – 22 km



- **DESCRIÇÃO:** Elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de implantação da rodovia BR-285/SC, incluindo o contorno de Timbé do Sul/SC.
- **LOA 2020:** R\$ 34.931.426,00
- **VALOR EMPENHADO:** R\$ 34.931.426,00

LOTE	ÚNICO	
VALOR CONTRATADO:	R\$	125.597.100,95
SALDO CONTRATUAL:	R\$	17.717.925,41
SALDO DE EMPENHO:	R\$	13.756.014,02



SITUAÇÃO

- **84% concluída;**
- 2 pontes concluídas, 3 viadutos concluídos, 1 viaduto (em fase de conclusão);
- km 35+600 ao 42+600, Pavimento Flexível executado, incluindo o contorno de Timbé do Sul;
- km 42+600 ao 50+600, Pavimento Rígido executado, incluindo serviços: (Drenagem e OAC);
- Em execução 1,8 km de pavimento flexível e 5 km de pavimento rígido.

ADEQUAÇÃO – na BR-282/SC e BR-158/SC – 164,30 km



- **DESCRIÇÃO:** Contratação Integrada de Serviços de Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e Construção das obras de Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoramentos e Eliminação de pontos críticos das rodovias BR-282/SC e BR-158/SC.
- **LOA 2020:** R\$ 78.365.740,00
- **VALOR EMPENHADO:** R\$ 76.358.181,00

LOTES	Único
- VALOR CONTRATADO:	R\$ 217.356.353,91
- SALDO CONTRATUAL:	R\$ 167.981.157,18
- SALDO DE EMPENHO:	R\$ 70.104.407,27



SITUAÇÃO

- A obra está em andamento com a restauração de mais de 20 km concluídos e implantação de 32 km de 3ª faixa.
- Serão entregues em 2020 na BR-282: 80 km de restauração e 32 km de 3ª faixa.
- Serão entregues em 2020 na BR-158: 10 km de restauração.



MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA





Contrato	BR	Km inicial	Km final	Intervenção	Situação	Providências
16 01053/2012	BR-153 BR-282 BR-470	0,0 335,7 303,7	119,8 457,7 358,9	CREMA	EM EXECUÇÃO	Previsão de executar 27 km de restauração.
16 01057/2012	BR-470	74,2	303,7	CREMA	EM EXECUÇÃO	Previsão de executar 10 km de restauração.
16 00461/2019	BR-280	178,2	306,3	CREMA	EM EXECUÇÃO	Previsão de executar 15 km de restauração.

SITUAÇÃO

- Toda malha rodoviária federal possui cobertura dos serviços de manutenção e conservação.
- CREMA – Previsão de licitação de 2 novos contratos de CREMA em 2021 (BR-153, BR-282 e BR-470).
- PROARTE – REABILITAÇÃO – Licitação do reforço e alargamento da Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu II na BR-470, em andamento.
- PROARTE – MANUTENÇÃO – Previsão de licitação dos serviços de manutenção de 22 OAEs na BR-470.

MANUTENÇÃO – Contratos de CREMA



OBRIGADO

