

DNIT

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES



FIESC

Abril de 2024

*Eng. Alysson Rodrigo de Andrade, M. Sc.
Superintendente Regional do DNIT/SC*

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

1. Construção
2. Gestão da Carteira
3. Manutenção
4. Projeção com LOA 2024
5. Novos projetos

CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Duplicação BR-280/SC



Duplicação BR-280/SC – Lote 1

DESCRIÇÃO: Duplicação da rodovia, em pavimento flexível, e contempla a construção de pistas novas, ruas laterais, restauração da pista existente, e 28 novos viadutos

SALDO A EXECUTAR: R\$ 301,4 milhões

ESTÁGIO: Necessidade de recursos para retomada (R\$ 100 mi/ano) e aprovação da RPFO na Sede (Brasília/DF).



Segmento Prioritário 2:
km 25+400 - km 28+200
(Região do IFC)

Segmento Prioritário 1:
km 3+000 - km 17+400
(Contorno SFS até Canal do Linguado)

Planejamento 2023 (1ª Fase):

- 26,15% executado
- 2ª RPFO
- Desapropriações
- Nova Supervisão de Obras
- Nova Gestão Ambiental
- Entregas CI-PBA (veículos, terrenos,...)
- Retomada das Obras Contorno SFS + IFC (48% do Lote 1)

Planejamento 2023/24 (2ª Fase):

- CI-PBA (Ciclovias 38,1km)
- Geotecnia
- Ajustes traçado (Itinga, Ferrovia)
- Canal do Linguado – Estudos decantação do canal com MPF

Duplicação BR-280/SC – Lote 1

DESCRIÇÃO: Duplicação da rodovia, em pavimento flexível, e contempla a construção de pistas novas, ruas laterais, restauração da pista existente, e 28 novos viadutos

SALDO A EXECUTAR: R\$ 301,4 milhões

ESTÁGIO: Necessidade de recursos para retomada (R\$ 100 mi/ano) e aprovação da RPFO na Sede (Brasília/DF).

SITUAÇÃO

- Contrato exauriu recursos do ACT e do OGU, remanejamento solicitado
- Continuidade das desapropriação no Contorno de SFS
- Revisões de projeto em fase de obras concluídas será necessária agenda com TCU para retomar o Lote.



Medição fevereiro/24
(PI+R): R\$ 0,00

Duplicação BR-280/SC – Lote 2.1

DESCRIÇÃO: Duplicação da rodovia, em pavimento flexível, e contempla a construção de pistas novas, ruas laterais, restauração da pista existente, além de 7 novas OAEs, sendo 2 passarelas, 2 pontes, 2 acessos e 1 passagem inferior.

SALDO A EXECUTAR: R\$ 70,3 milhões

ESTÁGIO: Em execução, obra com maior mobilização a partir de março.

Medição fevereiro/24 (PI+R):
R\$ 1.039.384,08

SITUAÇÃO

- RPFO aprovada e retomada do contrato
- Liberação da duplicação entre os km 49,1 e 50,7



Duplicação BR-280/SC – Lote 2.2

DESCRIÇÃO: Duplicação da rodovia, em pavimento flexível, contempla a construção de pistas novas, ruas laterais, restauração da pista existente e o Contorno de Jaraguá do Sul, 18 novas OAEs, incluindo dois túneis em paralelo (total de 2.110 metros de extensão), em pavimento rígido, para a transposição do Morro do Vieira

SALDO A EXECUTAR: R\$ 417,7 milhões

Medição fevereiro/24 (PI+R):
R\$ 10.006.340,75

ESTÁGIO: Em execução

SITUAÇÃO

- Serviços em execução
- Túnel: revestimento primário e secundário, inclusive tirantes + contenção em solo grampeado no emboque oeste
- Previsão de concluir 2,6 km + 3 OAEs no contorno de Jaraguá do Sul



Adequação BR-163/SC – Lote 1

DESCRIÇÃO: Obras remanescentes de adequação para ampliação da capacidade da BR-163. A obra é dividida em dois trechos, num total de 47,58 km, sendo 3,6 km no acesso ao Porto Internacional de Cargas e 43,98 km, entre os municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.

SALDO A EXECUTAR: R\$ 55,5 milhões

ESTÁGIO: Em execução

Medição fevereiro/24
(PI+R):
R\$ 8.744.310,55

SITUAÇÃO

- Em ritmo adequado de execução
- Restauração com pavimento rígido (whitetopping)
- Entrega de 39 km acumulados de um total de 47 km



Implantação BR-285/SC – Lote 1



DESCRIÇÃO: Implantação do Contorno de Timbé do Sul, na área urbana do município e a pavimentação da Serra da Rocinha, em pavimento rígido, além construção de 2 pontes e 4 viadutos.

SALDO A EXECUTAR: R\$ 3,7 milhões

ESTÁGIO: Em execução



Medição
fevereiro/24 (PI+R):
R\$ 1.987.314,50

SITUAÇÃO

- Obras de contenção em execução, ritmo retomado em agosto/23
- Estudando retomada dos comboios; necessidade de contenções complementares

Duplicação BR-470/SC – Lote 1



Duplicação BR-470/SC – Lote 1

DESCRIÇÃO: Duplicação e restauração da rodovia em pavimento flexível, construção de vias laterais, restauração da pista existente, 2 novas pontes e 10 viadutos, além da restauração de 3 OAEs

SALDO A EXECUTAR: R\$ 23,3 milhões (PI+R vigente)

ESTÁGIO: Em execução

Medição fevereiro/24
(PI+R):
R\$ 2.295.481,98



SITUAÇÃO

- Concluída e liberada duplicação do km 7,5 ao km 18
- Entregues 15 km de duplicação ao tráfego
- Início do viaduto do km 4

Duplicação BR-470/SC – Lote 2



Medição fevereiro/24
(PI+R):
R\$ 2.192.309,76

DESCRIÇÃO: Duplicação da rodovia em pavimento flexível, construção de vias laterais, restauração da pista existente, 2 novas pontes e 13 viadutos, além da restauração de 2 pontes

SALDO A EXECUTAR: R\$ 26,7 milhões (PI+R vigente)

ESTÁGIO: Em execução



SITUAÇÃO

- Em ritmo adequado de execução
- Entregues 19 km de duplicação ao tráfego
- Tráfego liberado nos viadutos dos km 22, 25, 32, 36, 38 e 42

Duplicação BR-470/SC – Lote 3

DESCRIÇÃO: Duplicação e restauração da rodovia, em pavimento flexível, construção de vias laterais, restauração da pista existente, 10 novas pontes e 21 viadutos

SALDO A EXECUTAR: R\$ 168,3 milhões (PI+R vigente)

ESTÁGIO: Em execução, com ritmo adequado

SITUAÇÃO

- Início das obras dos viadutos do Badenfurt, Segalas e Fortaleza
- Entregue o Complexo da Mafisa (3 pontes + 4 viadutos) do km 49,5 ao Km 51
- Continuidade das ações de desapropriação (Previsão de 2 Mutirões 2024, primeiro de 13 a 17 de maio)



Medição fevereiro/24 (PI+R):
R\$ 2.964.579,21

Duplicação BR-470/SC – Lote 4

DESCRIÇÃO: Duplicação e restauração da rodovia, em pavimento flexível, construção de vias laterais, restauração da pista existente, 9 novas pontes e 16 viadutos

SALDO A EXECUTAR: R\$ 132,9 milhões

ESTÁGIO: Em execução

Medição fevereiro/24 (PI+R):
R\$ 3.009.658,98



SITUAÇÃO

- Entregue duplicação de 5 km em Indaial, com viadutos liberados nos km 67, 68 e 72. Viaduto em construção km 70.
- Previsão de entrega de 2 km de pista duplicada e ponte km 71
- Continuidade e conclusão das ações de desapropriação (Previsão de 2 Mutirões 2024, primeiro de 13 a 17 de maio)





Gestão da carteira


GESTÃO FINANCEIRA

Via	Total Valor do Contrato (PI+R)	Total Medido (PI+R)	Total Saldo do Contrato (PI+R)	% Execução Financeira (PI+R)	Saldo de Empenho
<input type="checkbox"/> BR-470					
<input type="checkbox"/> Duplicação da BR-470/SC Navegantes - Indaial	R\$ 1.556,3 Mi	R\$ 1.205,0 Mi	R\$ 351,2 Mi	77,43%	R\$ 86,2 Mi
Lote 4	R\$ 307,2 Mi	R\$ 174,2 Mi	R\$ 132,9 Mi	56,72%	R\$ 22,5 Mi
Lote 3	R\$ 348,7 Mi	R\$ 180,4 Mi	R\$ 168,3 Mi	51,74%	R\$ 15,8 Mi
Lote 2	R\$ 527,1 Mi	R\$ 500,4 Mi	R\$ 26,7 Mi	94,93%	R\$ 21,6 Mi
Lote 1	R\$ 373,3 Mi	R\$ 350,0 Mi	R\$ 23,3 Mi	93,77%	R\$ 26,3 Mi
<input type="checkbox"/> BR-285					
<input type="checkbox"/> Implantação Tímbe do Sul - Divisa SC/RS BR-285/SC	R\$ 180,1 Mi	R\$ 176,4 Mi	R\$ 3,7 Mi	97,95%	R\$ 7,9 Mi
Lote Único	R\$ 180,1 Mi	R\$ 176,4 Mi	R\$ 3,7 Mi	97,95%	R\$ 7,9 Mi
<input checked="" type="checkbox"/> BR-282	R\$ 18,6 Mi	R\$ 0,2 Mi	R\$ 18,3 Mi	1,27%	R\$ 13,8 Mi
<input type="checkbox"/> BR-280					
<input type="checkbox"/> Duplicação da BR-280/SC - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul	R\$ 1.627,9 Mi	R\$ 838,4 Mi	R\$ 789,5 Mi	51,50%	R\$ 31,4 Mi
Lote 2.2	R\$ 976,9 Mi	R\$ 559,2 Mi	R\$ 417,7 Mi	57,24%	R\$ 2,8 Mi
Lote 2.1	R\$ 242,8 Mi	R\$ 172,5 Mi	R\$ 70,3 Mi	71,04%	R\$ 21,1 Mi
Lote 1	R\$ 408,2 Mi	R\$ 106,8 Mi	R\$ 301,4 Mi	26,15%	R\$ 7,5 Mi
<input type="checkbox"/> BR-163					
<input type="checkbox"/> Adequação de Capacidade da BR-163/SC	R\$ 294,2 Mi	R\$ 238,7 Mi	R\$ 55,5 Mi	81,13%	R\$ 8,1 Mi
Lote 2	R\$ 294,2 Mi	R\$ 238,7 Mi	R\$ 55,5 Mi	81,13%	R\$ 8,1 Mi
Total	R\$ 3.677,0 Mi	R\$ 2.458,8 Mi	R\$ 1.218,3 Mi	66,87%	R\$ 147,6 Mi

INVESTIMENTOS REALIZADOS

TOTAL DE MEDIÇÕES ANUAIS – DNIT/SC

Ano	Total Medido (PI+R)
2013	R\$ 597.663.938,10
2014	R\$ 836.663.295,60
2015	R\$ 500.816.876,17
2016	R\$ 422.409.632,75
2017	R\$ 445.949.772,47
2018	R\$ 494.547.181,65
2019	R\$ 485.679.179,53
2020	R\$ 537.752.775,79
2021	R\$ 430.660.011,86
2022	R\$ 614.037.972,17
2023	R\$ 954.691.858,09
2024	R\$ 135.453.927,10
Total	R\$ 6.456.326.421,28

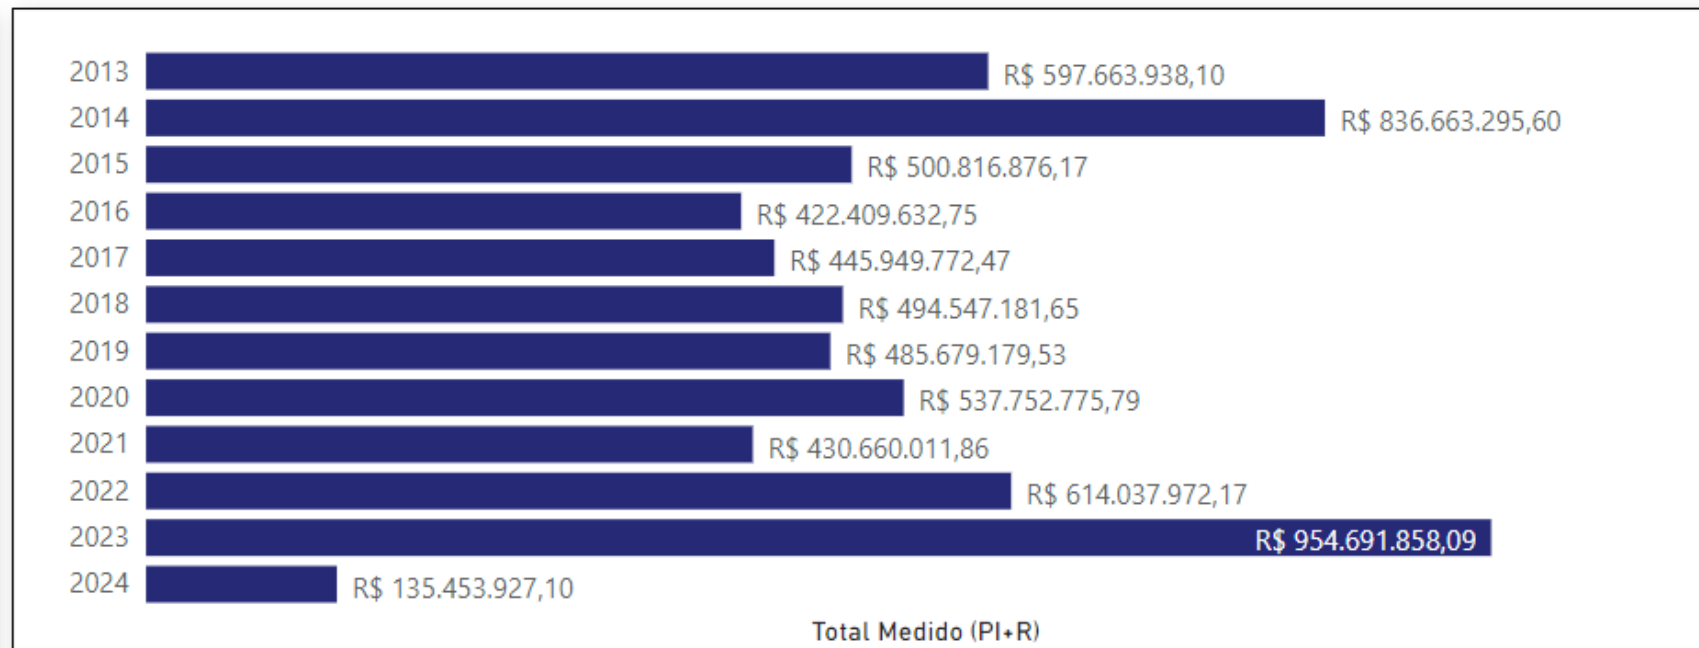


INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2023

MEDIÇÕES + DESAPROPRIAÇÃO + PBA-CI – DNIT/SC

PROGRAMA (A)	DISPONÍVEL 2023 (D = B+C)	MEDIÇÕES 2023 (E)	DESAPROPRIAÇÃO 2023 (F)	PBA - CI 2023 (G)	INVESTIMENTO 2023 (H = E + F + G)
Manutenção Rodoviária sobre Supervisão da Superintendência Regional DNIT Santa Catarina	558.158.558,90	445.214.276,39	0,00	0,00	445.214.276,39
Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina	278.806.238,89	155.810.117,12	27.722.122,55	15.891.136,99	199.423.376,66
Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC - No Estado de Santa Catarina	317.499.322,81	201.429.413,86	78.438.414,38	0,00	279.867.828,24
Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC - No Estado de Santa Catarina	34.131.080,24	26.112.083,39	0,00	0,00	26.112.083,39
Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Dionísio Cerqueira - na BR-163/SC - No Estado de Santa Catarina	150.045.584,56	111.470.862,22	0,00	0,00	111.470.862,22
Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC - no Estado de Santa Catarina	42.281.952,58	14.655.105,11	0,00	0,00	14.655.105,11
Total	1.380.922.737,98	954.691.858,09	106.160.536,93	15.891.136,99	1.076.743.532,01

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

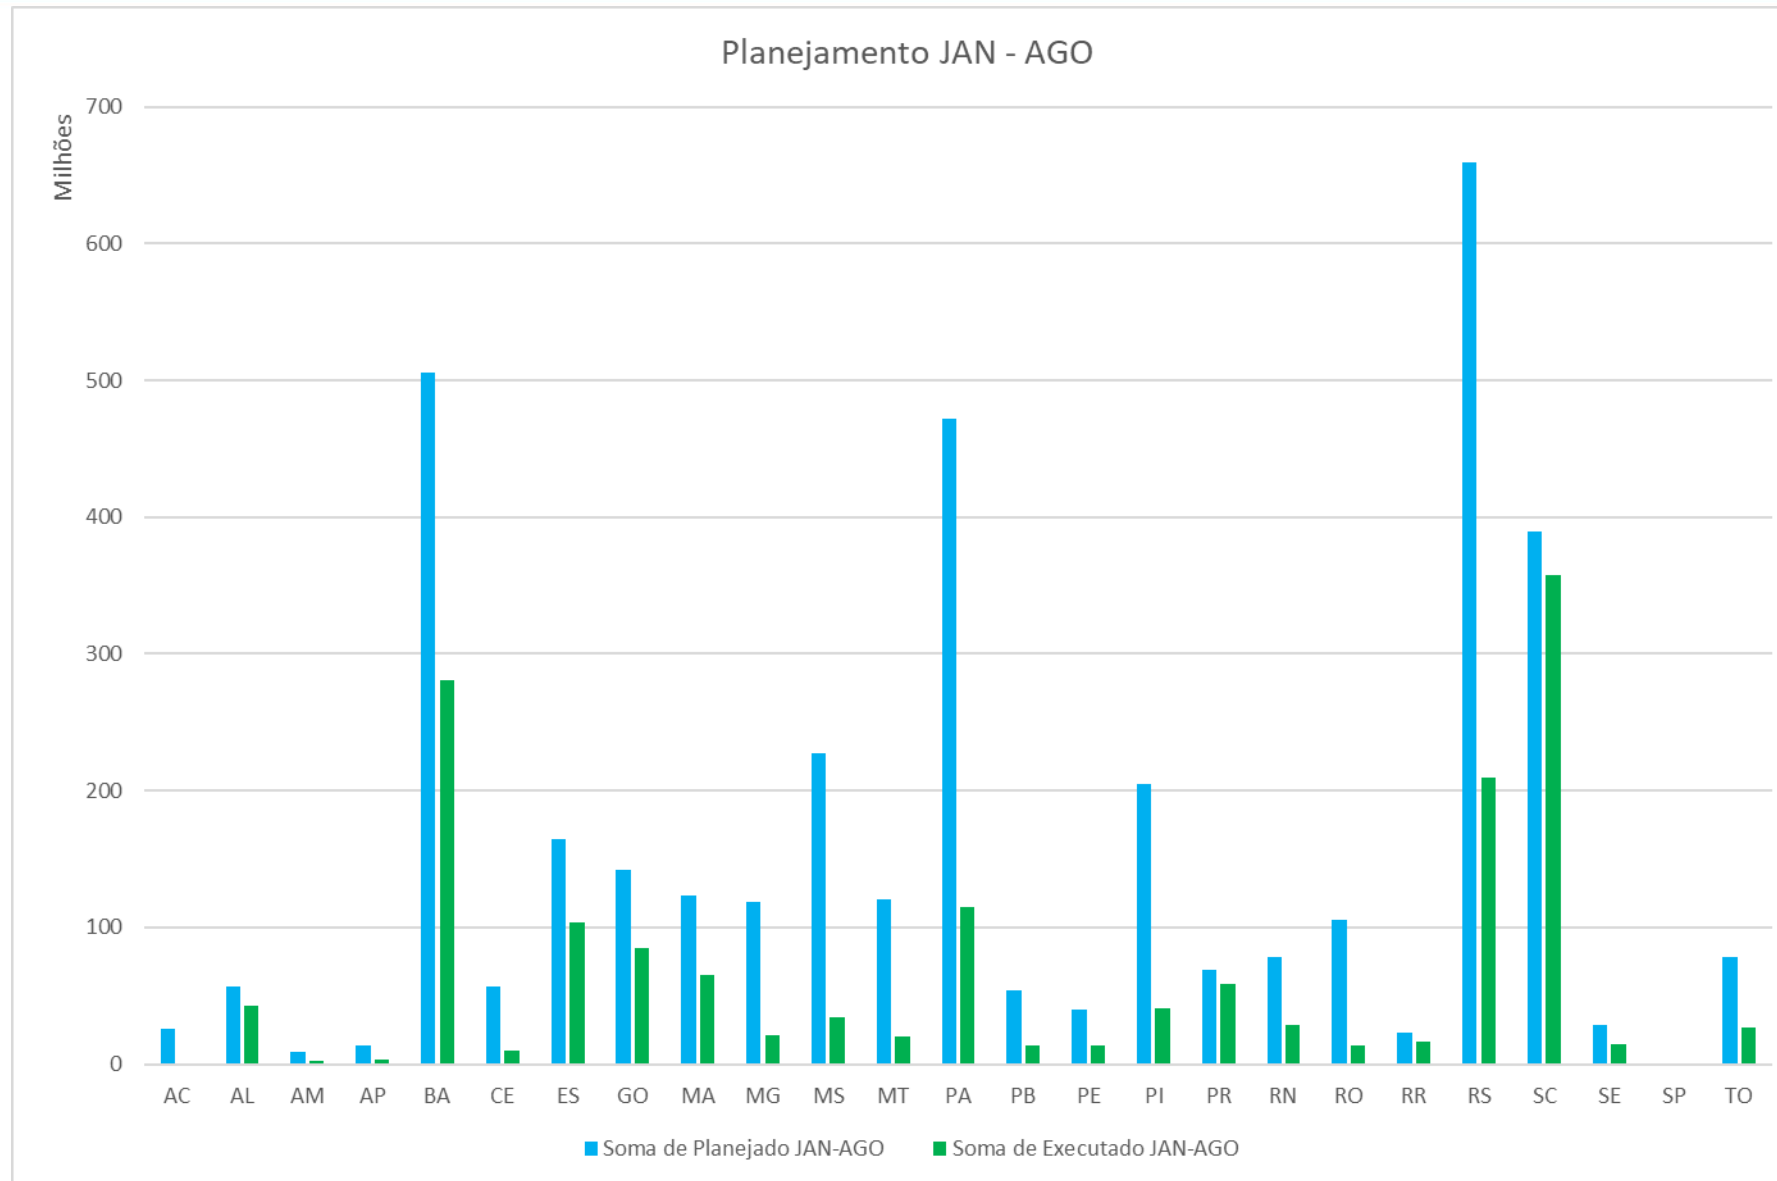

Manutenção

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES



Extensão da Malha: 1.579,50 km

100% da malha rodoviária coberta

- 10 CONTRATOS CONSTRUÇÃO
- 6 CONTRATOS DE SUPERVISÃO
- 10 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
- 1 CONTRATO DE CREMA
- 1 CONTRATO PROARTE
- 6 CONTRATOS DE EMERGÊNCIA
- 3 CONTRATOS DE GESTÃO AMBIENTAL
- 1 CONTRATO DE GESTÃO INDÍGENA
- 1 CONTRATO APOIO À DESAPROPRIAÇÃO
- 1 CONTRATO DE PROJETOS
- TOTAL: 40 CONTRATOS**


Este mapa foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo DNIT e pode sofrer alterações sem aviso prévio. A responsabilidade pelo conteúdo deste mapa é de inteira responsabilidade do DNIT.



Mapa elaborado pelo DNIT em parceria com o GEOTEC. O GEOTEC é uma empresa especializada em serviços de geotecnia e topografia.



ICM – Meta do ano!

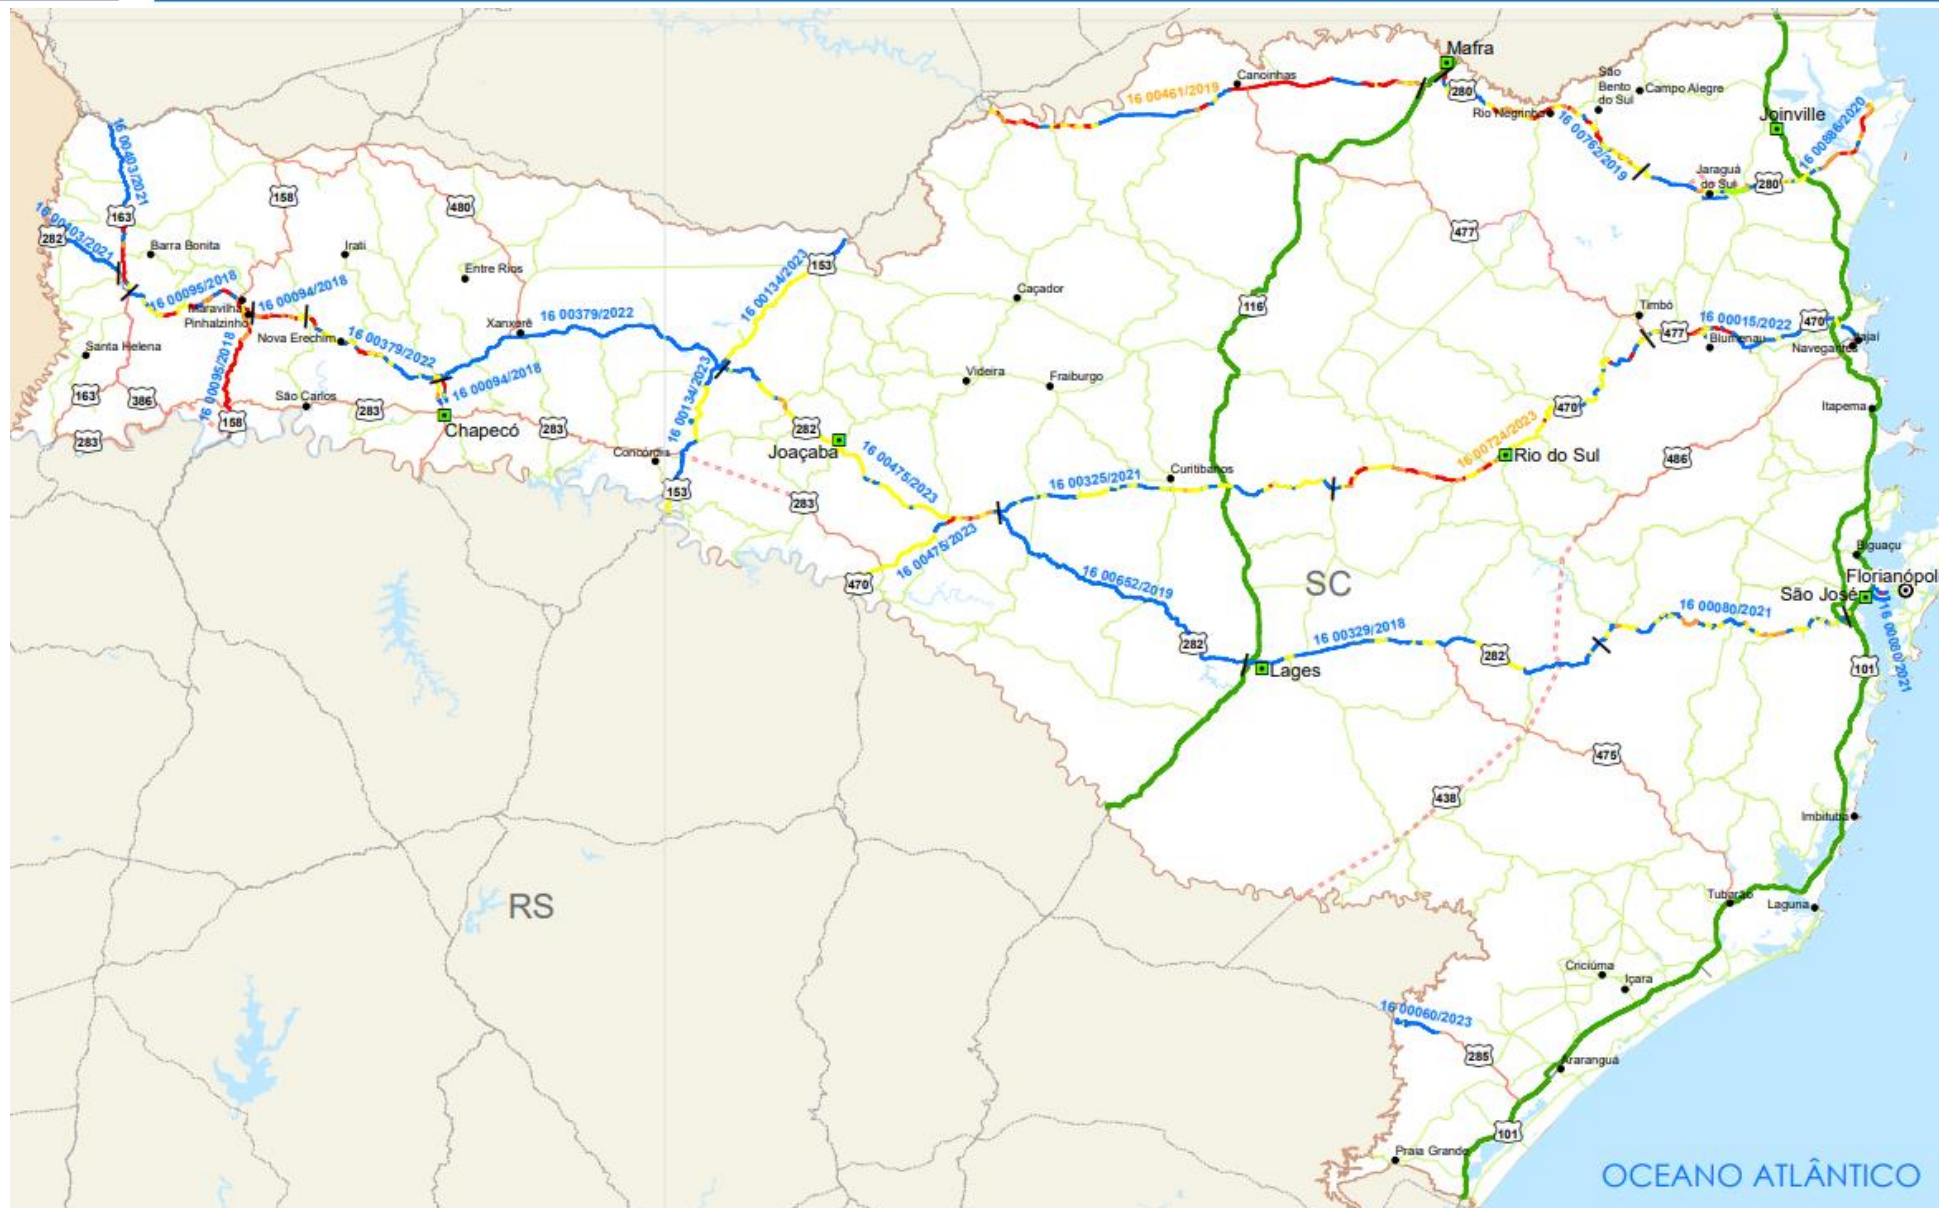


LEGENDA

- ULs_DNIT
- ⊙ CAPITAIS
- CIDADES
- RODOVIAS ESTADUAIS
- RODOVIAS FEDERAIS
- CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL
- CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO
- - - FEDERAL - PLA
- - - FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV

Nº DE CONTRATO

- CONSERVA
- CREMA
- RESTAURAÇÃO
- DESCOBERTO

FAIXA	CONDIÇÃO
ICM < 30	BOM
30 < ICM < 50	REGULAR
50 < ICM < 70	RUIM
ICM > 70	PÉSSIMO

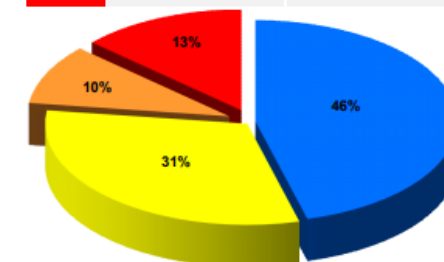

Nota: $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

$IP = PPanels \times 50 + PRemodos \times 30 + PTRincimento \times 20$
 $IC = PRoçada \times 30 + PDrenagem \times 20 + PSinalização \times 50$

ICM: Índice da Condição da Manutenção;


IP: Índice do Pavimento;

IC: Índice da Conservação

Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis na SUPRA, até janeiro 2024.

Versão Atualizada SNV 2023 - AGOSTO/23

CREMA/PATO/Emergências

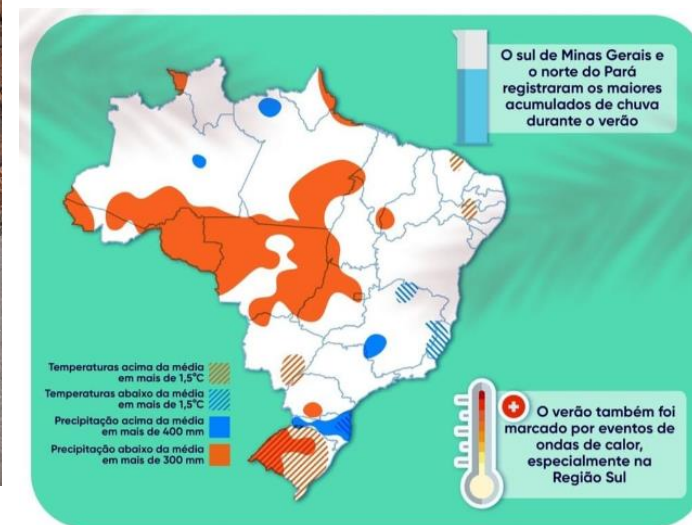


Emergências



Contratos Emergencias SC - 2022 / 2023 /2024

contrato	Rodovia	Km inicial	km final	Extensão (km)	Valor Contrato
004/2024	BR-282/SC	103,8	325,8	222	70.668.163,29
005/2024	BR-470/SC	9,9	249,2	Pontos localizados : km 10+350, 86+000, 107+560, 110+200,119+800, 136+000, 136+940, 142+050, 145+700, 146+800, 149+700, 151+900, 158+000, 185+560, 186+609, 188+000, 188+600, 188+100, 201+000, 208+000, 218+550	92.548.775,24
006/2024	BR-470/SC	9,9	249,2	Pontos localizados : km 99+680 - km 143+730 - km 149+000 - km 173+350 - km 203+000 - km 238+000 - km 239+000	78.059.502,90
176/2023	BR-470/SC	69	116,4	47,4	46.468.559,61
380/2023	BR-280/SC	64,2	111,5	47,3	41.939.530,80
445/2023	BR-280/SC	57	57	Ponto localizado: km 57,7	7.184.161,99
723/2022	BR-280/SC	64,2	111,5	47,3	49.697.628,32
724/2022	BR-282/SC	0 15,5	5,4 103,8	93,7	50.517.519,98
a contratar	BR-153/SC	46,5	50,2	Ponto localizado: km 49,0	11.500.000,00
a contratar	BR-480/SC	123,7		Passarela de pedestres km 123,7	1.500.000,00
Total					450.083.842,13

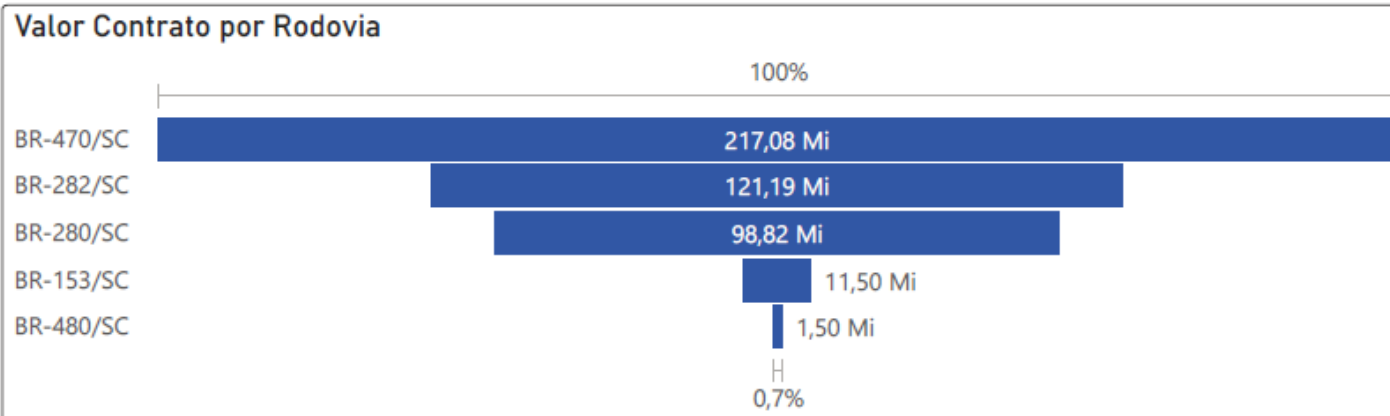



LOA 2024

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTES

LOA 2023 x PLOA 2024

Desafio do DNIT/SC!

PROGRAMA (A)	2022 RAP (B)	2023 DOTAÇÃO (C)	DISPONÍVEL 2023 (D = B+C)	INVESTIMENTO 2023 (H = E + F + G)	2023 RAP (H = D - G)	PLOA 2024	Cardápio de emendas DNIT	Projeção Emendas
Manutenção	168.855.754,90	389.302.804,00	558.158.558,90	394.514.464,14	163.644.094,76	230.000.000,00	70.000.000,00	-
BR-280/SC	15.066.213,89	263.740.025,00	278.806.238,89	189.742.117,75	89.064.121,14	173.852.949,00	105.000.000,00	53.400.000,00
BR-470/SC	51.413.209,81	266.086.113,00	317.499.322,81	270.752.323,55	46.746.999,26	145.551.306,00	70.000.000,00	77.400.000,00
BR-285/SC	24.529.212,24	9.601.868,00	34.131.080,24	23.925.952,18	10.205.128,06	0,00	1.000.000,00	50.400.000,00
BR-163/SC	25.900.966,56	124.144.618,00	150.045.584,56	107.467.892,86	42.577.691,70	45.252.629,00	45.000.000,00	51.400.000,00
BR-282/SC	11.001.205,58	31.280.747,00	42.281.952,58	14.655.105,11	27.626.847,47	48.517.102,00	20.000.000,00	53.475.423,00
BR-163/SC (Ponte)	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-
Ferrovia São Francisco	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	400.000,00
Total	296.766.562,98	1.084.156.175,00	1.380.922.737,98	1.001.057.855,59	379.864.882,39	643.173.986,00	400.000.000,00	286.475.423,00

LOA 2024 DNIT SC

Programa	Código	DETALHAMENTO	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO ESPECIAL	DOTACAO CANCELADA E REMANEJADA	DOTACAO ATUALIZADA
2678231067XW70042	7XW7	Adequação de Contorno Rodoviário em Araranguá - na BR-101/SC	R\$40.720.410,00				R\$40.720.410,00
2678231067N860042	7N86	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento SC-416(B) (Jaraguá do Sul) - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	R\$47.500,00				R\$47.500,00
2678231067XJ50042	7XJ5	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - São Miguel do Oeste - na BR-282/SC - no Estado de Santa Catarina	R\$48.480.688,00				R\$48.480.688,00
26782310675300042	7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$141.249.797,00				R\$141.249.797,00
26782310610JQ0042	10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$163.162.785,00				R\$163.162.785,00
26782310612KF0042	12KF	Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Dionísio Cerqueira - na BR-163/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$43.443.783,00				R\$43.443.783,00
2678331081K244546	1K24	Construção de Contorno Ferroviário em Joinville- EF-485/SC - No Município de Joinville - SC	R\$9.187.378,00				R\$9.187.378,00
26783390112767000	1276	Construção de Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul - EF-485/SC - No Município de São Francisco do Sul - SC	R\$400.000,00				R\$400.000,00
2678231067N850042	7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285/SC - No Estado de Santa Catarina	R\$983.000,00				R\$983.000,00
267823106163Q00SC	163Q	INTERVENÇÕES PARA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA SOBRE SUPERVISÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT / SANTA CATARINA	R\$191.794.968,00				R\$191.794.968,00
Total			R\$639.470.309,00				R\$639.470.309,00

Novos Projetos

DNIT DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES



EVTEA


**BR-282
SÃO MIGUEL DO OESTE**
Trecho: 223,1 ao 650,9 (427,8 km)
ESTUDO CONCLUÍDO

**BR-280
JARAGUÁ DO SUL**
Trecho: 71,5 ao 306,6 (235,1 km)
ESTUDO CONCLUÍDO


**BR-470
CURITIBANOS**
Trecho: 0 ao 234,5 (234,5 km)
ESTUDO CONCLUÍDO

**BR-486
PORTO DE ITAJAÍ – BOM RETIRO**
Trecho: 0,00 ao 167,10
ESTUDO EM ANDAMENTO


**BR-282
FLORIANÓPOLIS ENTR. BR-116**
Trecho: 0 ao 223,1 (223,1 km)
ESTUDO CONCLUÍDO

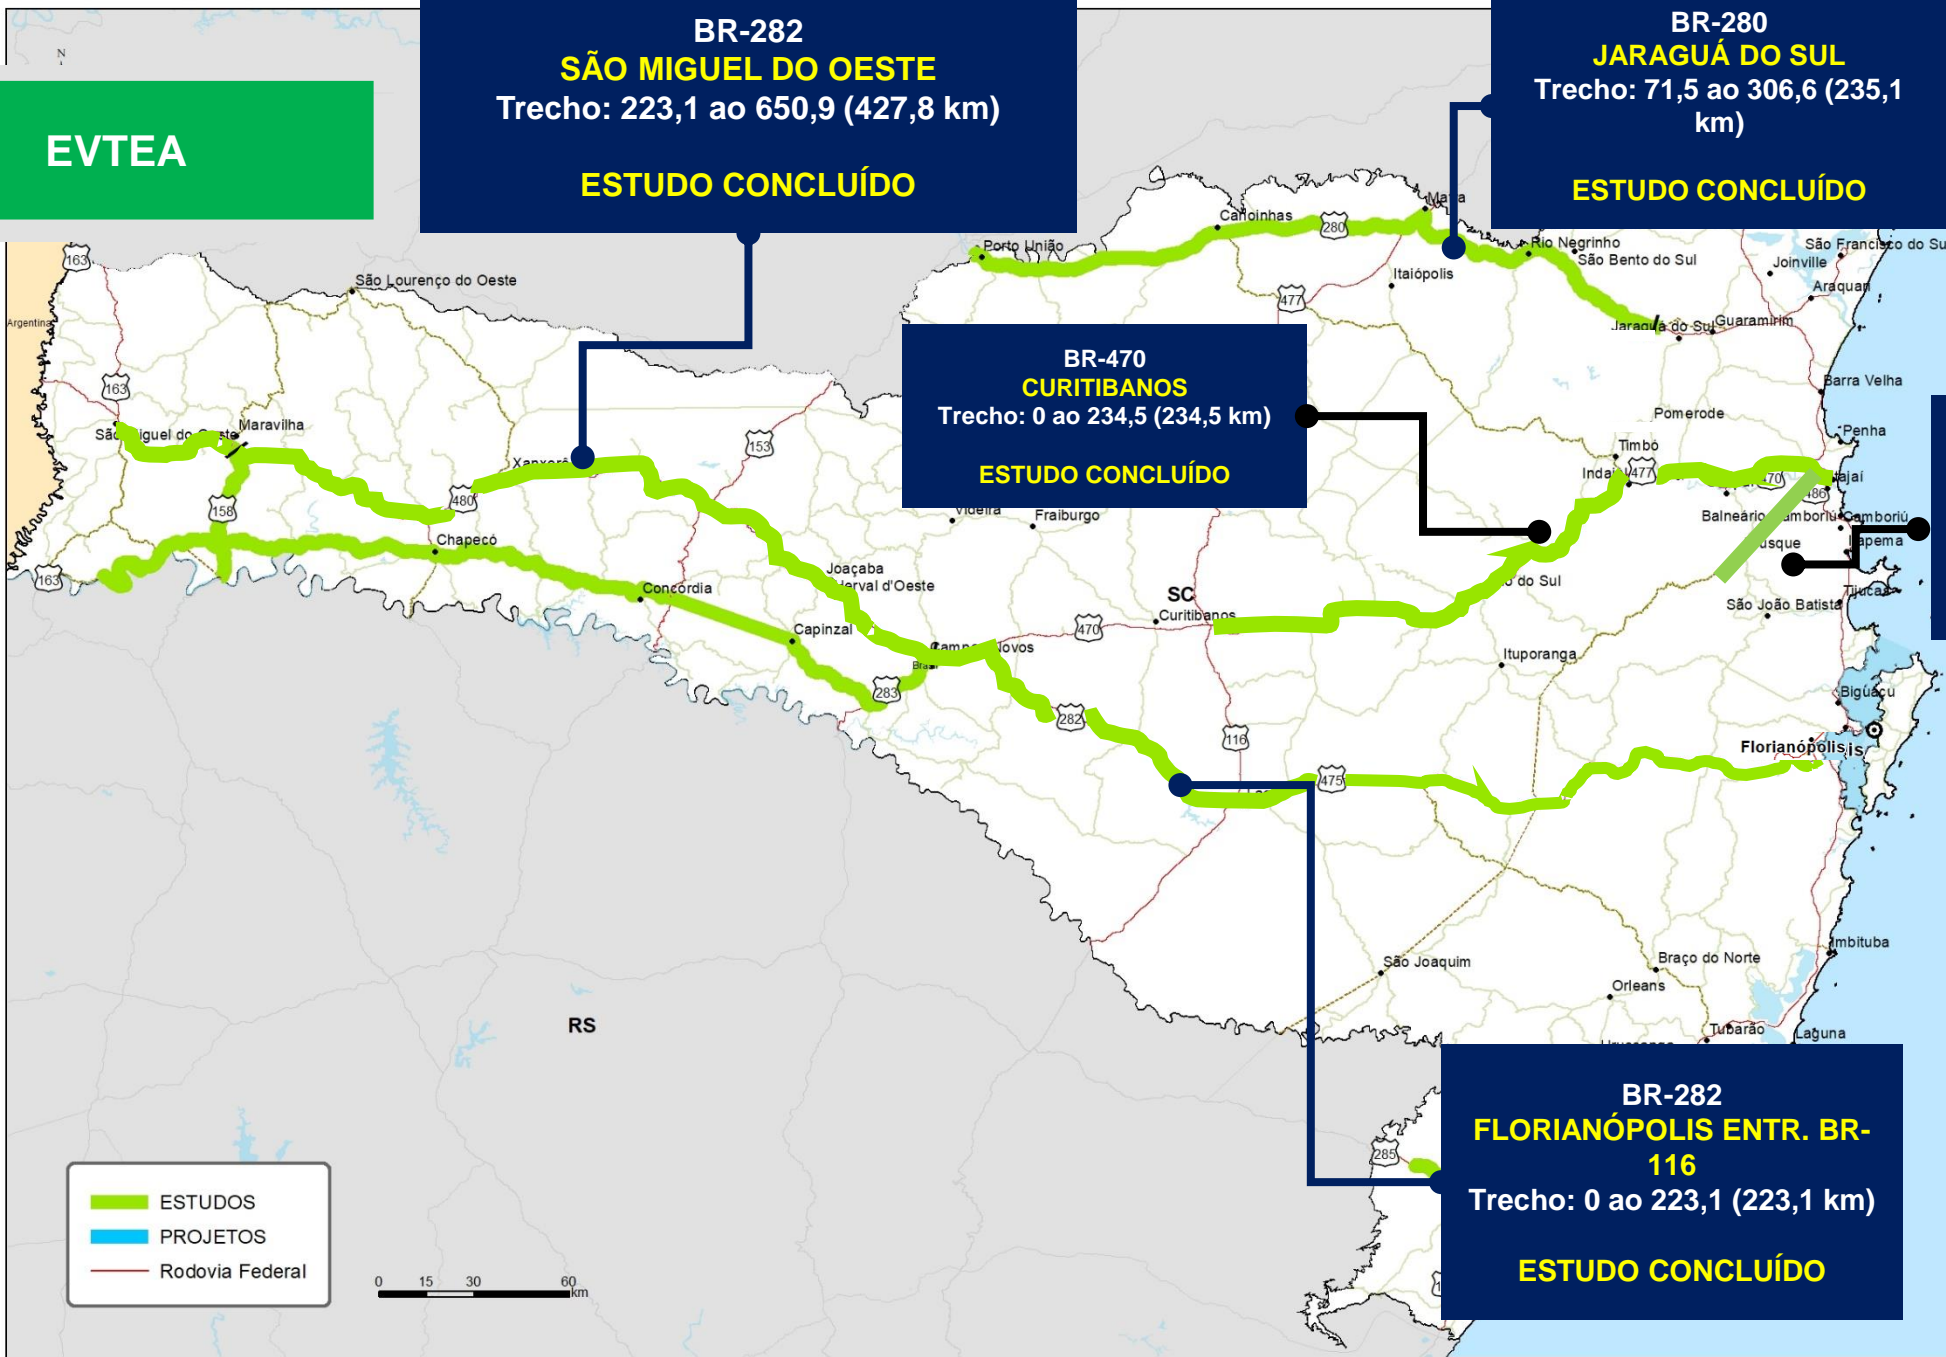


- ESTUDOS
- PROJETOS
- Rodovia Federal



Novos Projetos – Santa Catarina

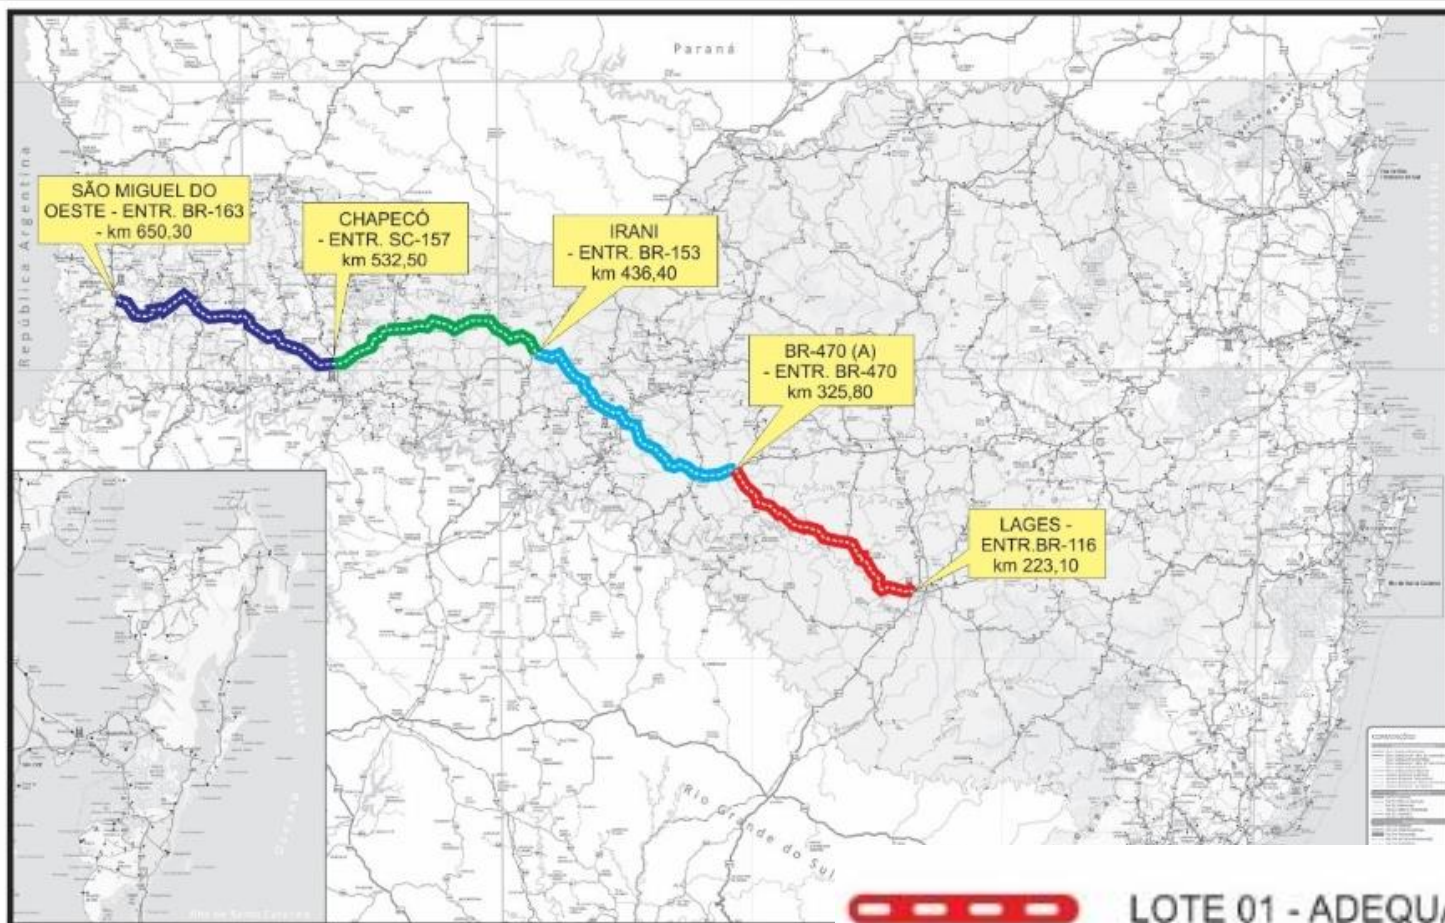

RODOVIA: BR-282/SC
TRECHO : FLORIANÓPOLIS FRONT. BRASIL/ARGENTINA(PONTE SOBRE O RIO PEPERIGI)
SUBTRECHO : ENTR. BR-116 - ENTR. BR-163 (B)
SEGMENTO : km 223,1 ao km 650,3
EXTENSÃO : 427,2 km



- LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIAS - 102,7 km
- LOTE 02 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - 110,6 km
- LOTE 03 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - 96,34 km
- LOTE 04 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - 117,8 km


AVISO DE LICITAÇÃO RDC Eletrônico Nº 00404/2023 - UASG 393003

Nº Processo: 50600002257202318. Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia visando a execução das obras de duplicação, adequação de capacidade e melhorias de segurança com eliminação de pontos críticos da rodovia BR-282/SC, entre o entroncamento com a BR-116/SC (Lages) e o entroncamento com a BR-163/SC (São Miguel do Oeste).. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 12/09/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: San Q. 03 Bloco "a" - Mezanino, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393003-99-00404-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 12/09/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Abertura das Propostas: 03/10/2023 às 15h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido na Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações ou por meio dos sites: www.dnit.gov.br ou www.gov.br/compras ..

CRISTIANO FERREIRA COSTA
Presidente da Comissão de Licitação

(SIASGnet - 11/09/2023) 393003-39252-2023NE800661

Novos Projetos – Santa Catarina

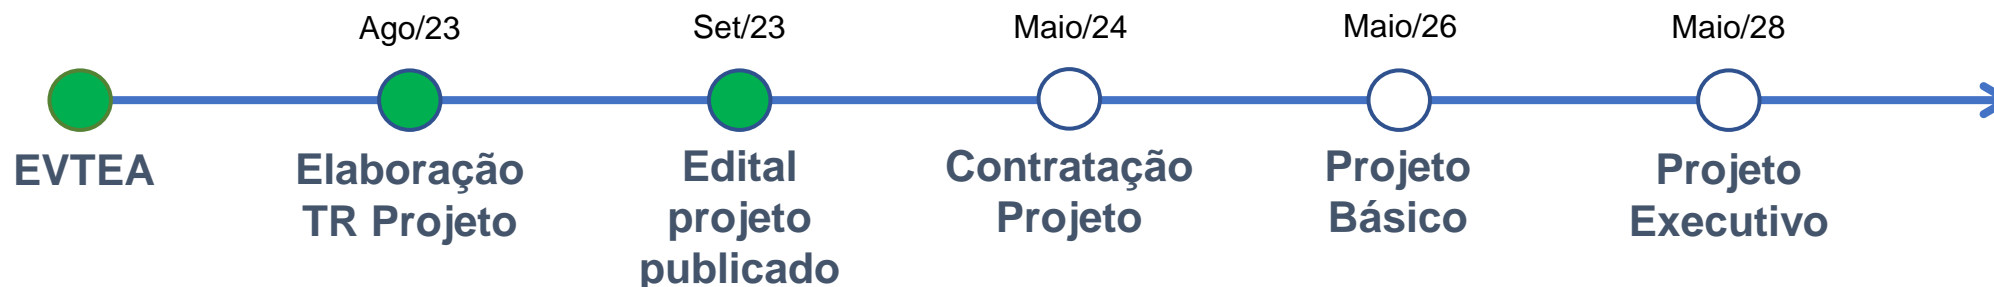

Construção

Rodovia: BR-282/SC – Lages – Entr. BR-163/SC

Extensão: 427,20 km

Estimativa do empreendimento:

R\$ 2,8 bilhões**

** Estimativa com base no CMG

Novos Projetos – Santa Catarina



IMPLANTAÇÃO DE TÚNEL

CONTORNO RODOVIÁRIO DE PALHOÇA - SANTO AMARO



AVISO DE LICITAÇÃO

RDC Eletrônico Nº 00408/2023 - UASG 393003

Nº Processo: 50600011382202319. Objeto: Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação em Pista Duplicada do Contorno Rodoviário de Palhoça/Santo Amaro da Imperatriz, na BR-282/SC. Lote único. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/09/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h55. Endereço: Saun Quadra 3 Bloco a, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393003-99-00408-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 12/09/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Abertura das Propostas: 03/10/2023 às 15h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.dnit.gov.br.

CAMILA DUARTE E SILVA

Presidente da Comissão

(SIASGnet - 11/09/2023) 393003-39252-2023NE800661

Novos Projetos – Santa Catarina



Construção

Rodovia: BR-282/SC - Contorno de Santo Amaro

Extensão: 7,0 km (túnel de 1,7 km)

Estimativa do empreendimento:

R\$ 400 milhões**

** Estimativa com base no CMG



Novos Projetos – Santa Catarina




Construção/Adequação

Rodovia: BR-470/SC

Extensão: 228 km - Indaial – Campos Novos


Estimativa do empreendimento:

R\$ 4 bilhões**

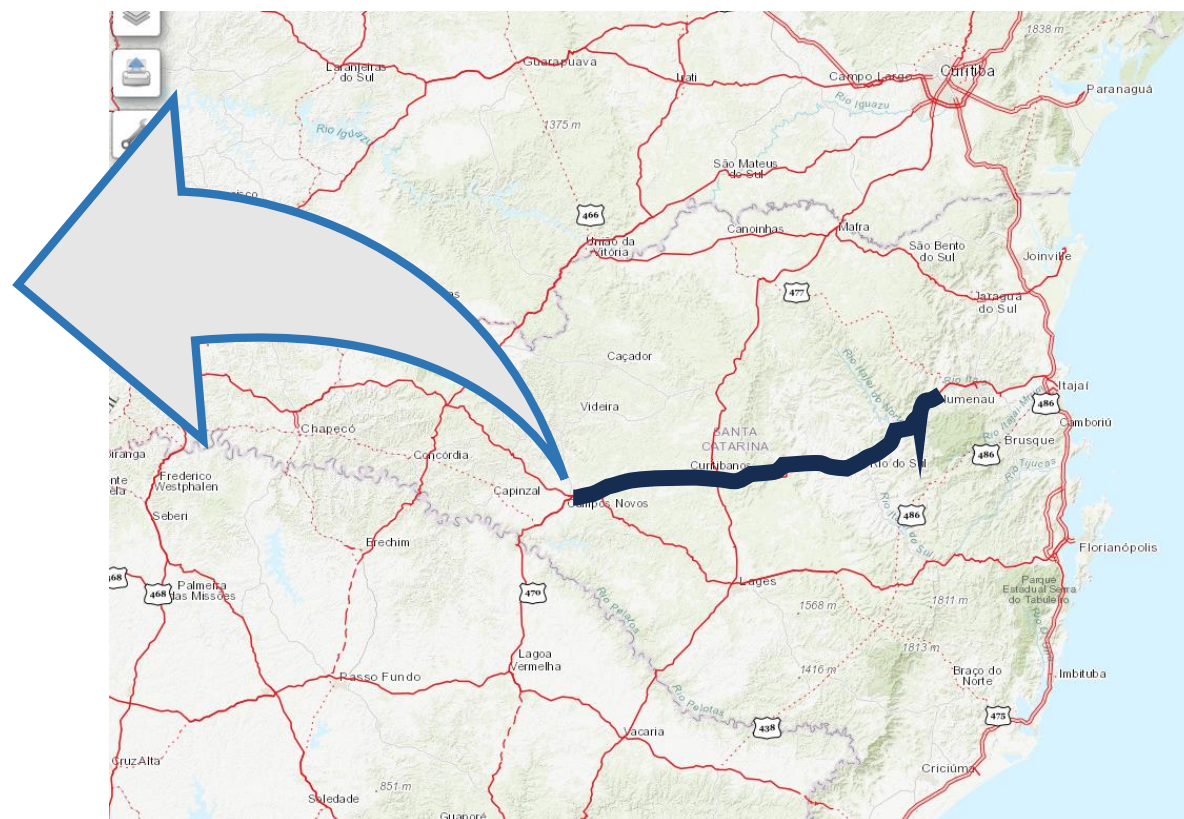



Novos Projetos – Santa Catarina

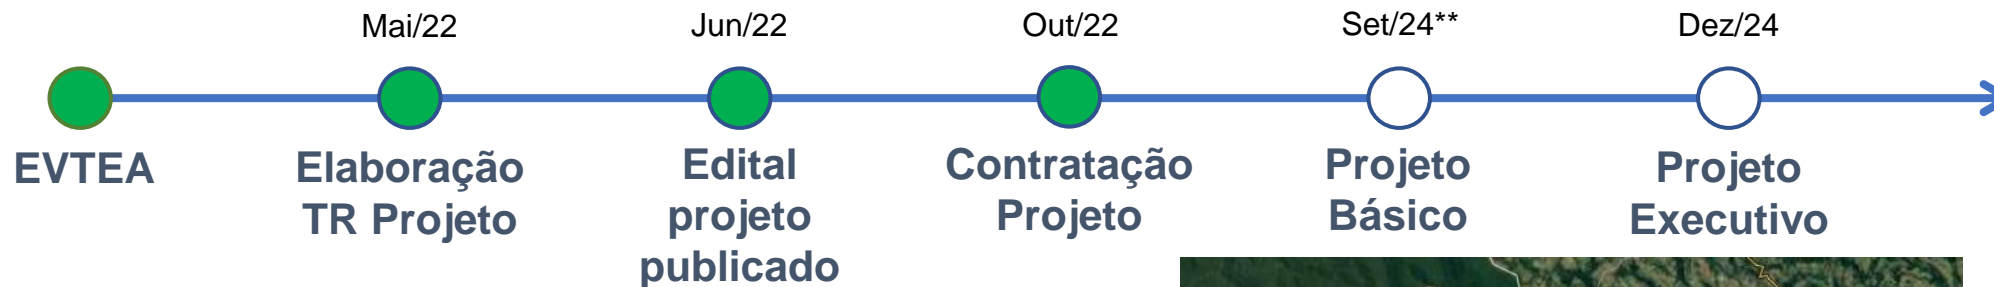


Construção/Adequação

Rodovia: BR-163/SC/RS

Extensão: 32 km (SC) e 24,90 km (RS)
e construção da Ponte Itapiranga (SC)
– Barra do Guarita (RS)

Estimativa do empreendimento:
R\$ 300 milhões

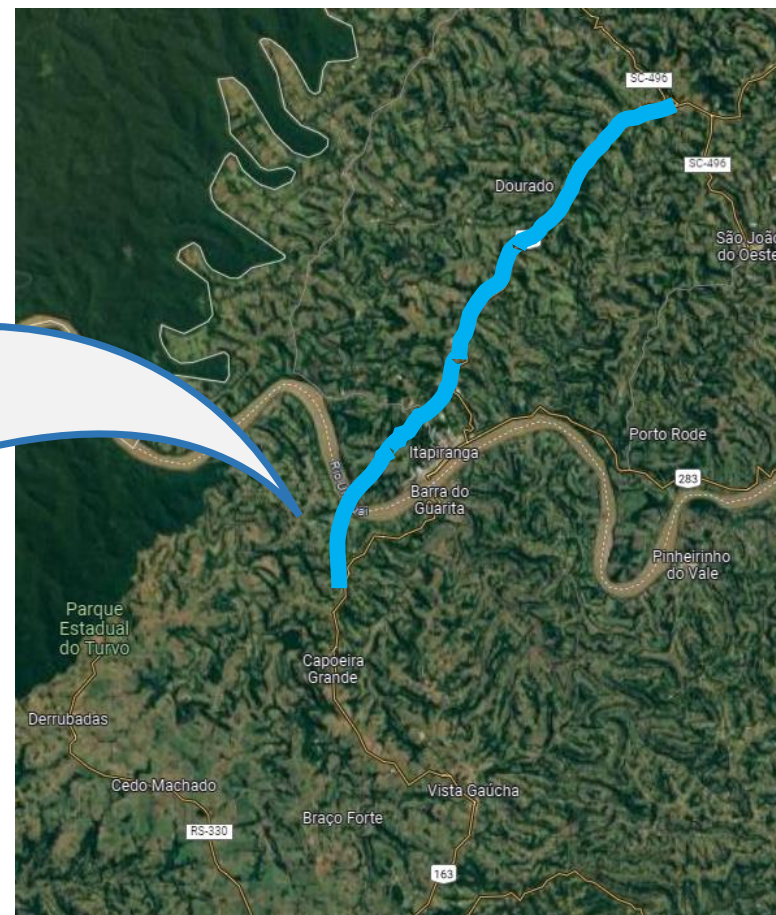

** Estimativa com base no CMG

OBRIGADO!



dnit.official
eng.alyssonandrade

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
